



SLUIT AAN OP X

SLUITAAN OP X

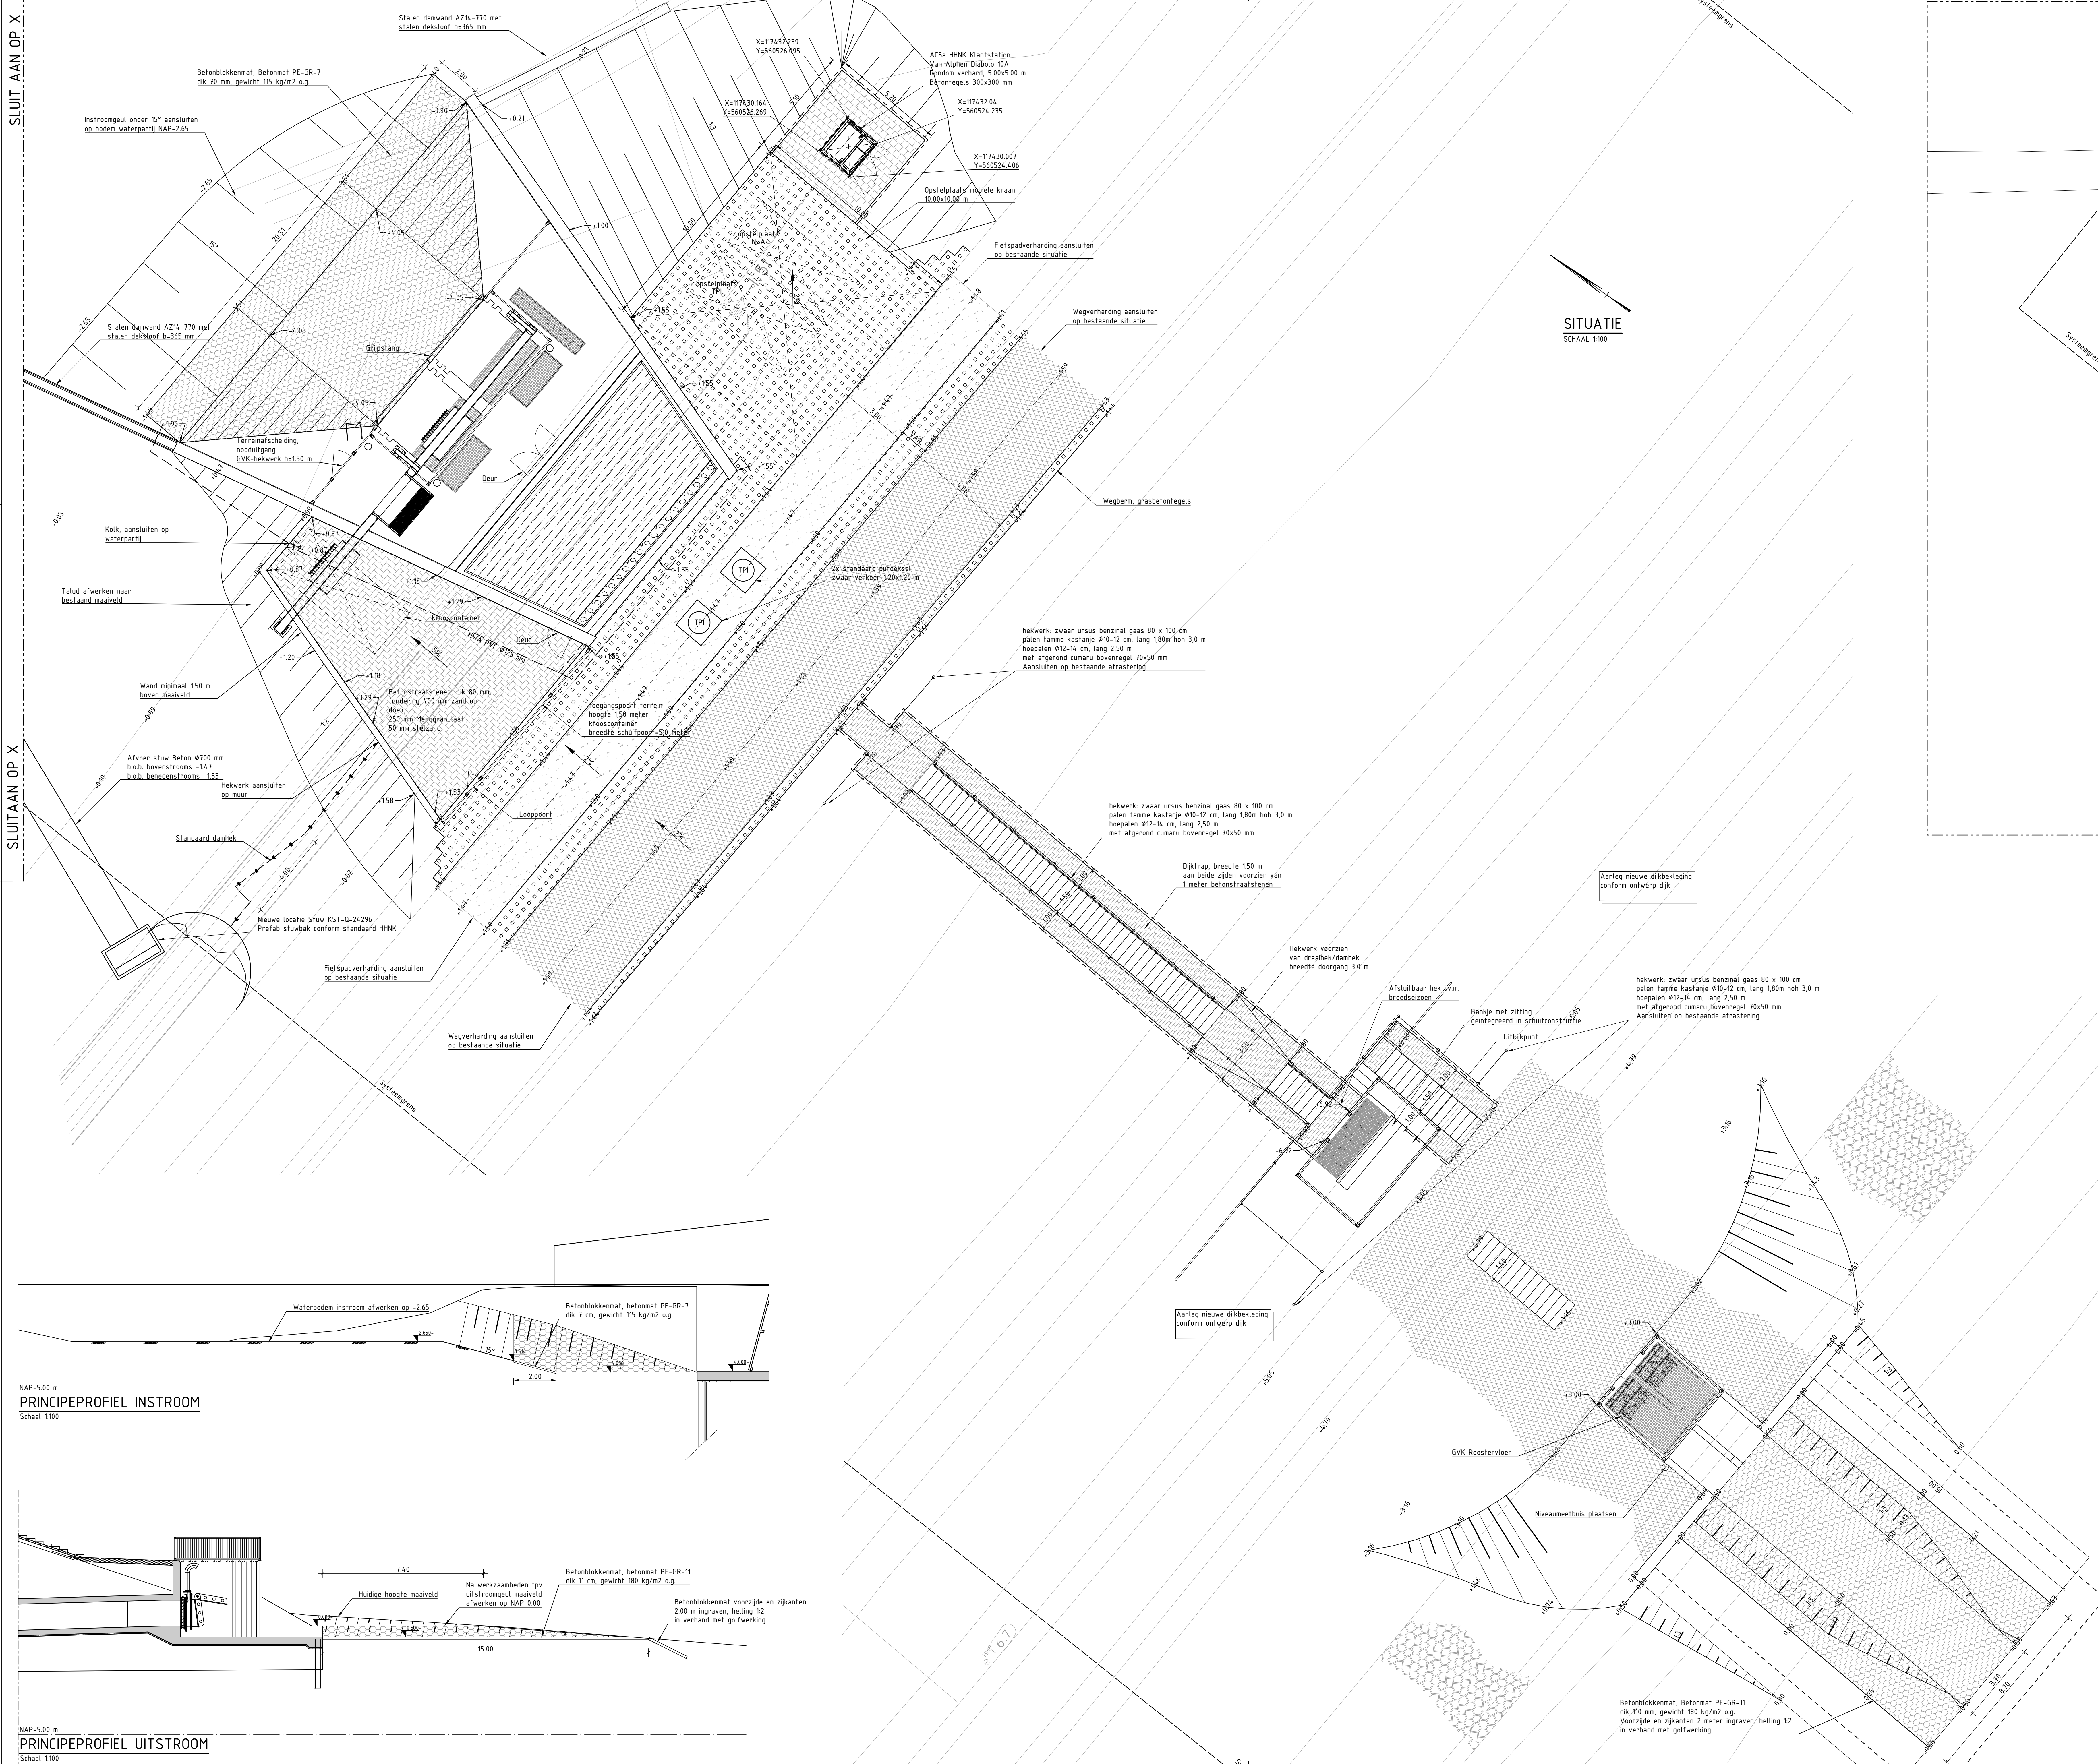

SITUATIE
SCHAAL 1:100

Gemeente Texel .txl
Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 1008067
kenmerk document: Bijlage 3 van 8
Burgemeester en Wethouders van Texel,
namens deen, de manager Dienstverlening,
mevrouw W. Veier

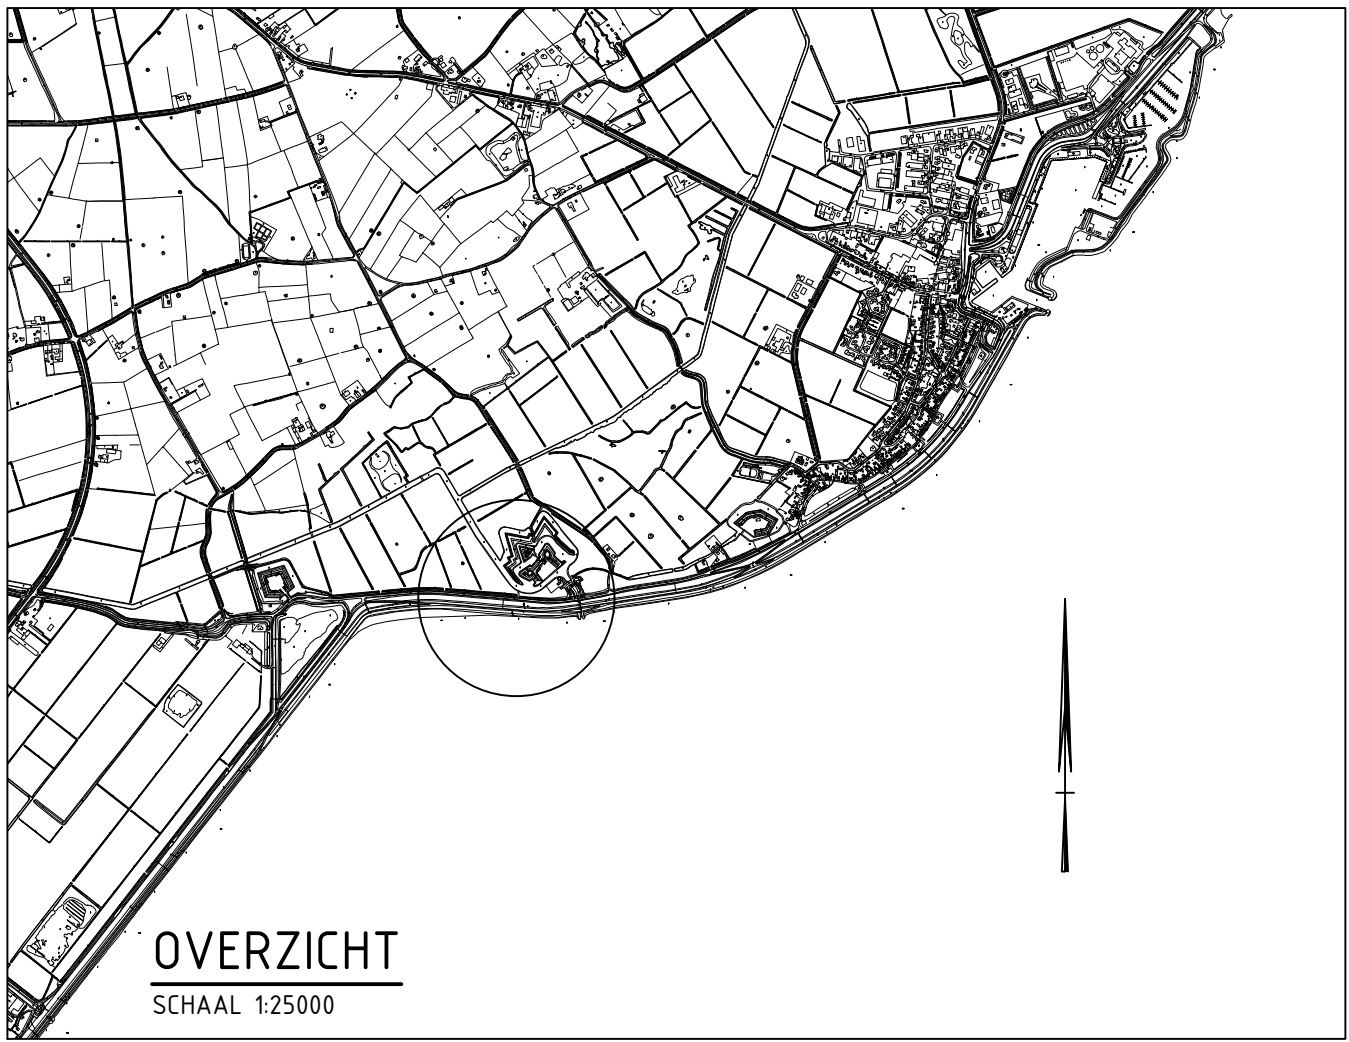

LEGENDA

	Asfaltverharding		Betonstegegels 300x300x45 mm halfsteensverband
	Betonverharding fietspad		Bodembescherming blokkenmat
	Grasbetselstenen		Basalt
	Betonstraatstenen halfsteensverband		Hoogtemaat nieuwe situatie
	Betonstraatstenen elleboogverband		Opsluitband 100x200 mm

OPMERKINGEN

- Maten in m, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in m t.o.v. NAP
- Coördinaten in m t.o.v. RD

A	02-09-2016	MSR	BEE	BEE	Openeringen HNRW: verwerkt
Revisie	Datum	Gefabed	Gecontroleerd	Vrijgegeven	Vrijgegeven

WIJZIGINGSBEHEER DOCUMENT HISTORIE

Opdrachtgever:



Logo Gemeat De Schans DO

Gemeat De Schans DO

Opdrachtgever

Project:

Dijkversterking Waddenzeedijk Texel

Opdrachtgever:

HHNK-HWBP


Takenomschrijving:

Gemeat De Schans DO

Situatie

Gefab:	MSR	Doc. Type:	TEKENING	Doc. Nr.:	-	Status:	DEFINITIEF
Geacht:	BEE	Proj.Nr.:	12354/D	Schaal:	Zie Tekening		
Vrijgave:	BEE	Takennummer:		Blad:	1/1		
Datum:	29/07/2026		100	Revisie:			




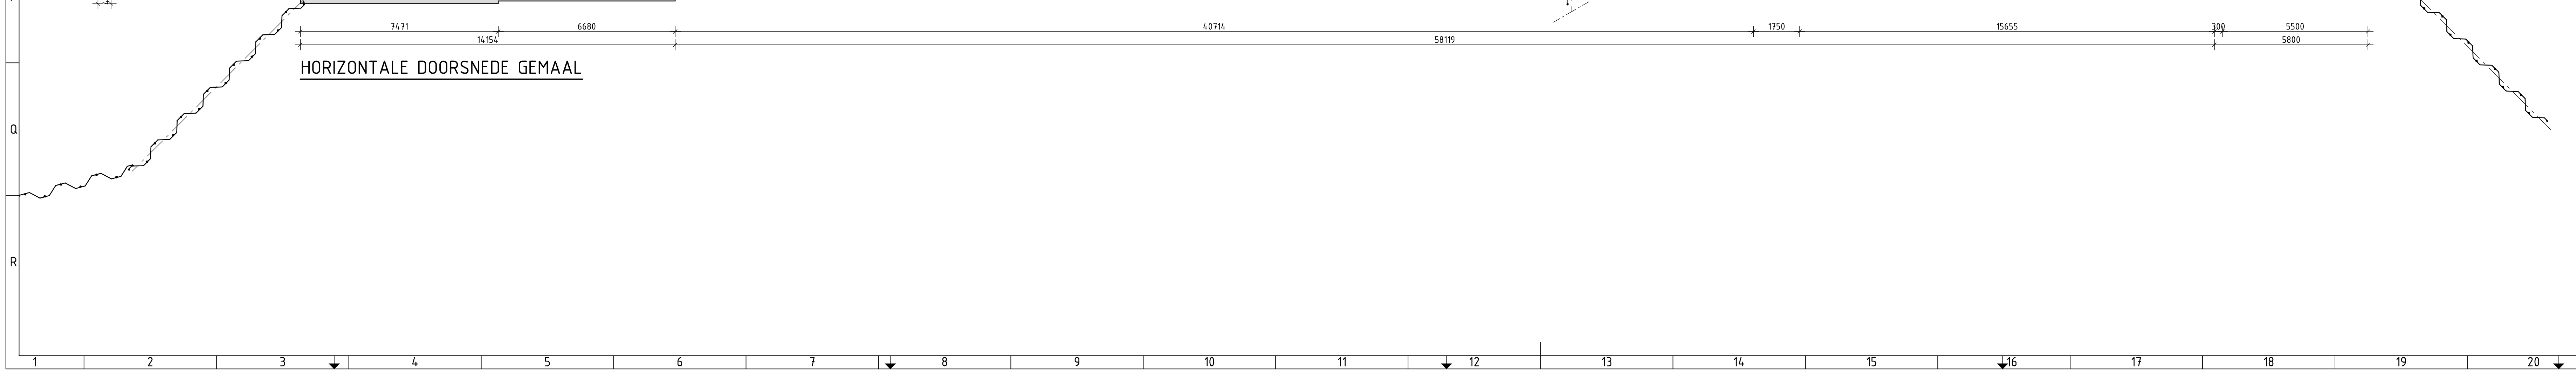

21	22	23
----	----	----

© Boskalis, Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

Pagina 1 van 1

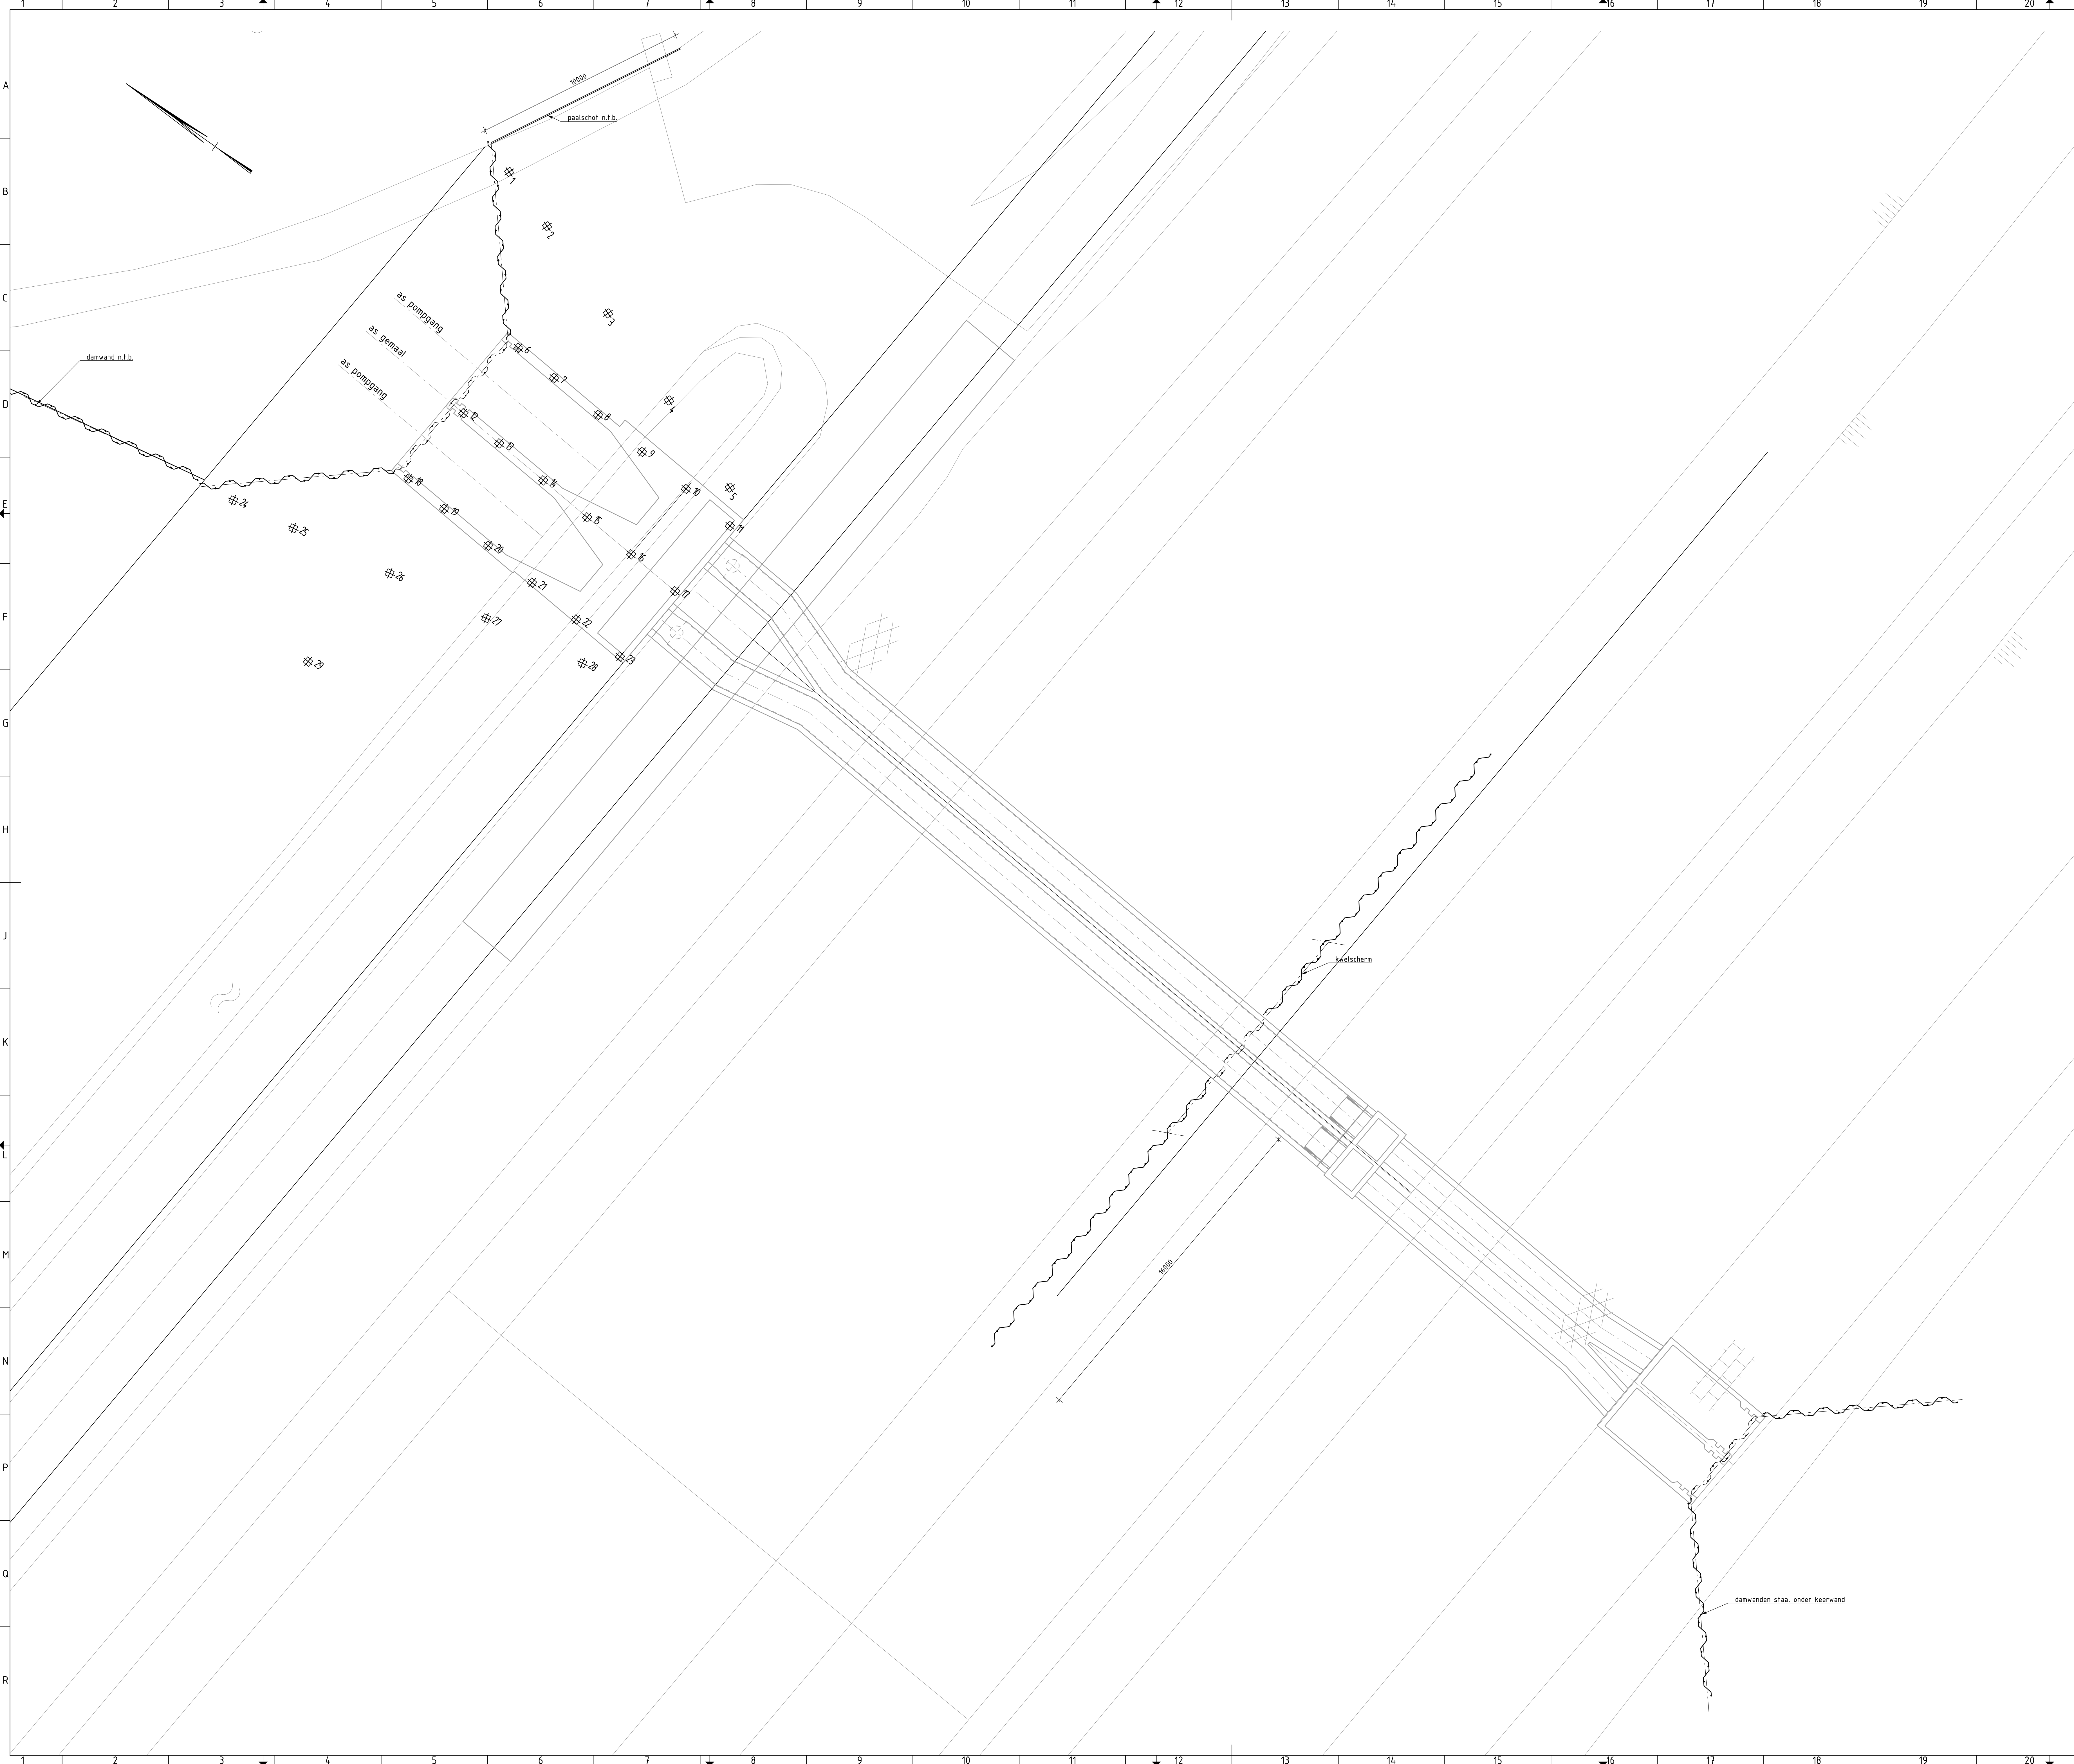

SITUATIE AANVOERSLOOT

SCHAAL 1:200

Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 1280067
Kenmerk document: Bijlage 5.8
Burgemeester en Wethouders van Texel,
namens dezer, de manager Dienstverlening,
mevrouw W. Veltner

LEGENDA

- grasbfontegels
- betonsstraatstenen
- asfalt
- basaltblokken

OPMERKINGEN

- Raken in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoogtenaaf in m T.o.v. N.A.P.



SITUATIE

SCHAAL 1:25000



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.0	4-10-2015	A.	BN	BN	Staten damwand onder keervand uitstroos (10000 versie)
Revisie	Datum	Gefab	Gecont.	Vrijgegeven	Wijzigingen

WIJZIGINGSBEHEER DOCUMENT HISTORIE

Opdrachtgever: **Waddenzeedijk Texel**



Project: **Dijkversterking Waddenzeedijk Texel**

Takenomschrijving: **HNK-HWBP**

Gemaal De Schans

DO-Palen en damwandenplan

Gefab:	A.	Doc. Type:	TEKENING	Doc. Nr.:	-	Status:	Definitief
Gecont.:	BN	Proj. Nr.:	-	Schaal:	1:100		
Vrijgegeven:	BN	Takenomschrijving:		Blad:	1/1		
Datum:	4-10-2015	DWT	114K1 DO 4.03	Revisie:	2.0		





Project
Dijkversterking Waddenzeedijk Texel









Opdrachtgever
HHNK-HWBP

Taakomschrijving
Gemaal De Schans
DO-Aanlichten en Doorsneden



KWS

Item nr.	Doc. Type	TITEL/NAM	Doc. nr.	Status	Definitief
Geotechn. 01	Profilen			Bevat	1 / 11
Vrijgaven 01A	Veiligheidsplan			Bevat	1 / 1
01A-10-01	DO-A-10-01	DO-A-10-01		Bevat	1 / 1



LEGENDA

	gewapend beton
	prefabibeton
	basal zuilen - doorsnede

OPMERKINGEN

-Maken in m, en zij anders aangegeven
Hoofdmaken in m t.o.v. NAP.

- Uitwerking aluminium kozijnen door leverancier in U0-fase



	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
2.0	4-10-2015	JL	BN	BN	(100% versie)
Revisie	Datum	Gerekeed	Gecontroleerd	Vrijgegeven	Mitsgijnen


</




Fase 1: Bestaande situatie 1 september 2016




Fase 2: Aanbrengen damwanden instroom 1 september 2016

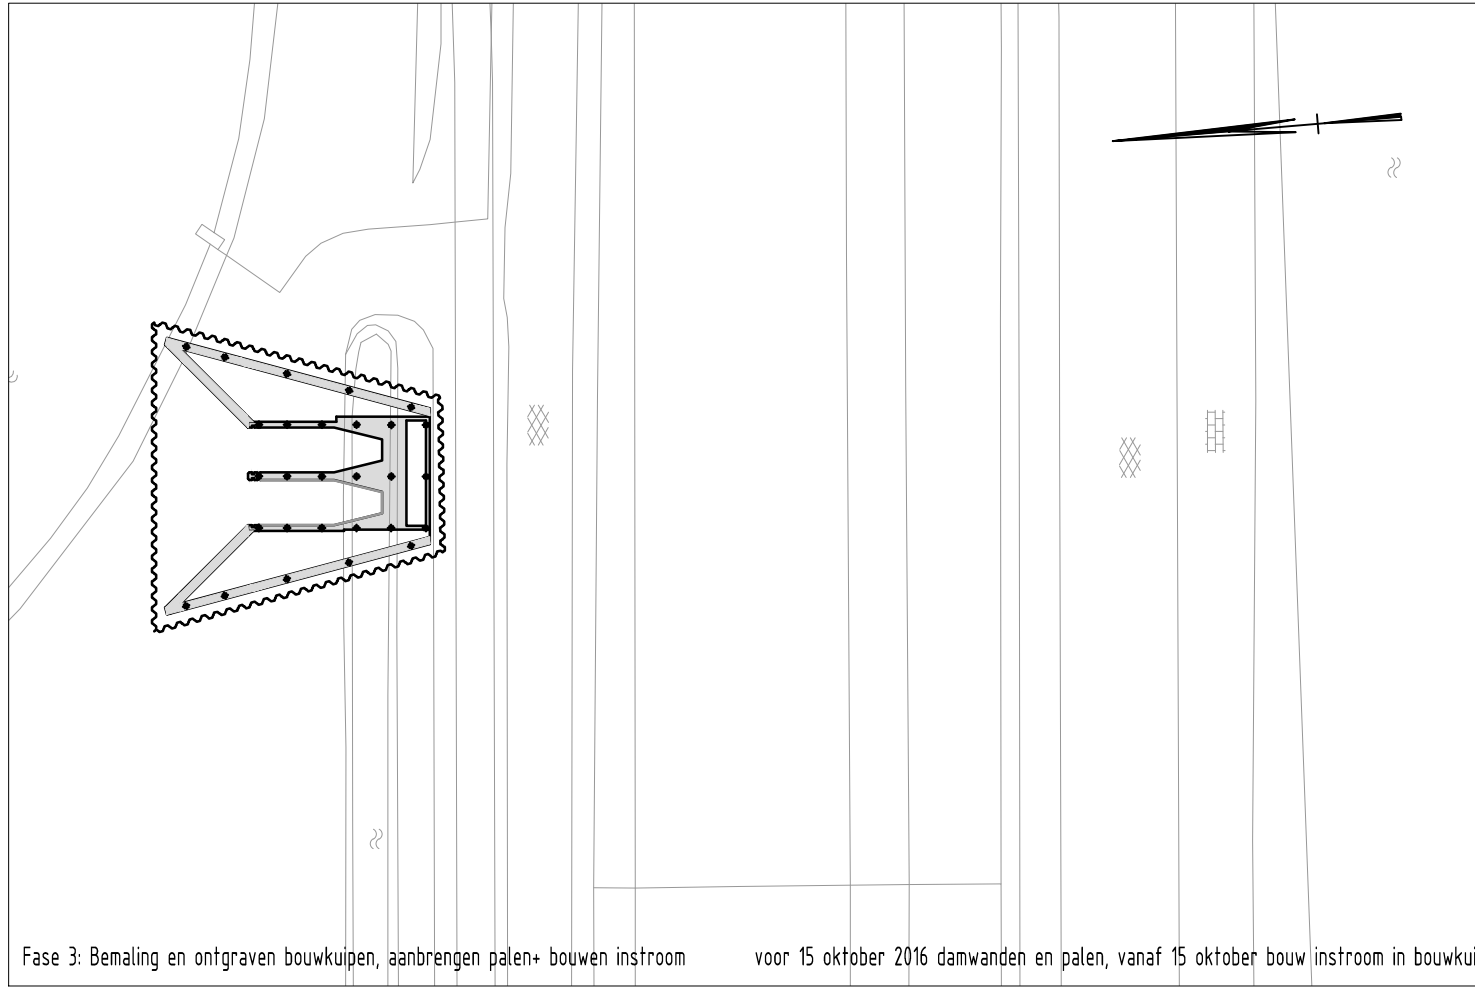


Fase 3: Bemaling en ontgraven bouwkuipen, aanbrengen palen+ bouwen instroom voor 15 oktober 2016 damwanden en palen, vanaf 15 oktober bouw instroom in bouwkuip

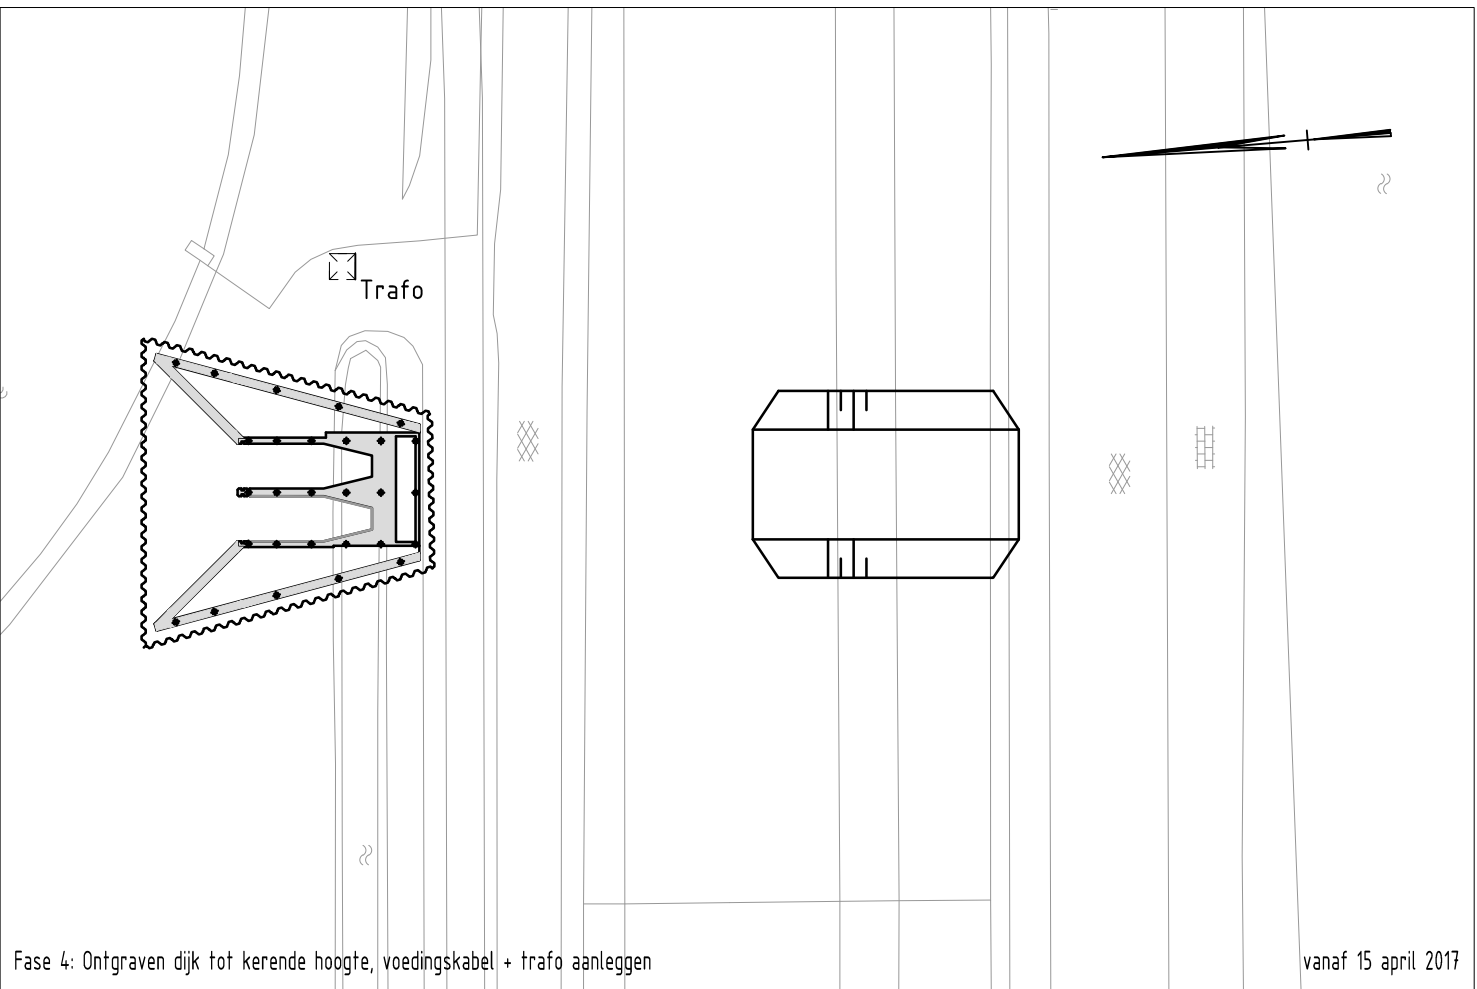


Fase 4: Ontgraven dijk tot kerende hoogte, voedingskabel + trafo aanleggen vanaf 15 april 2017

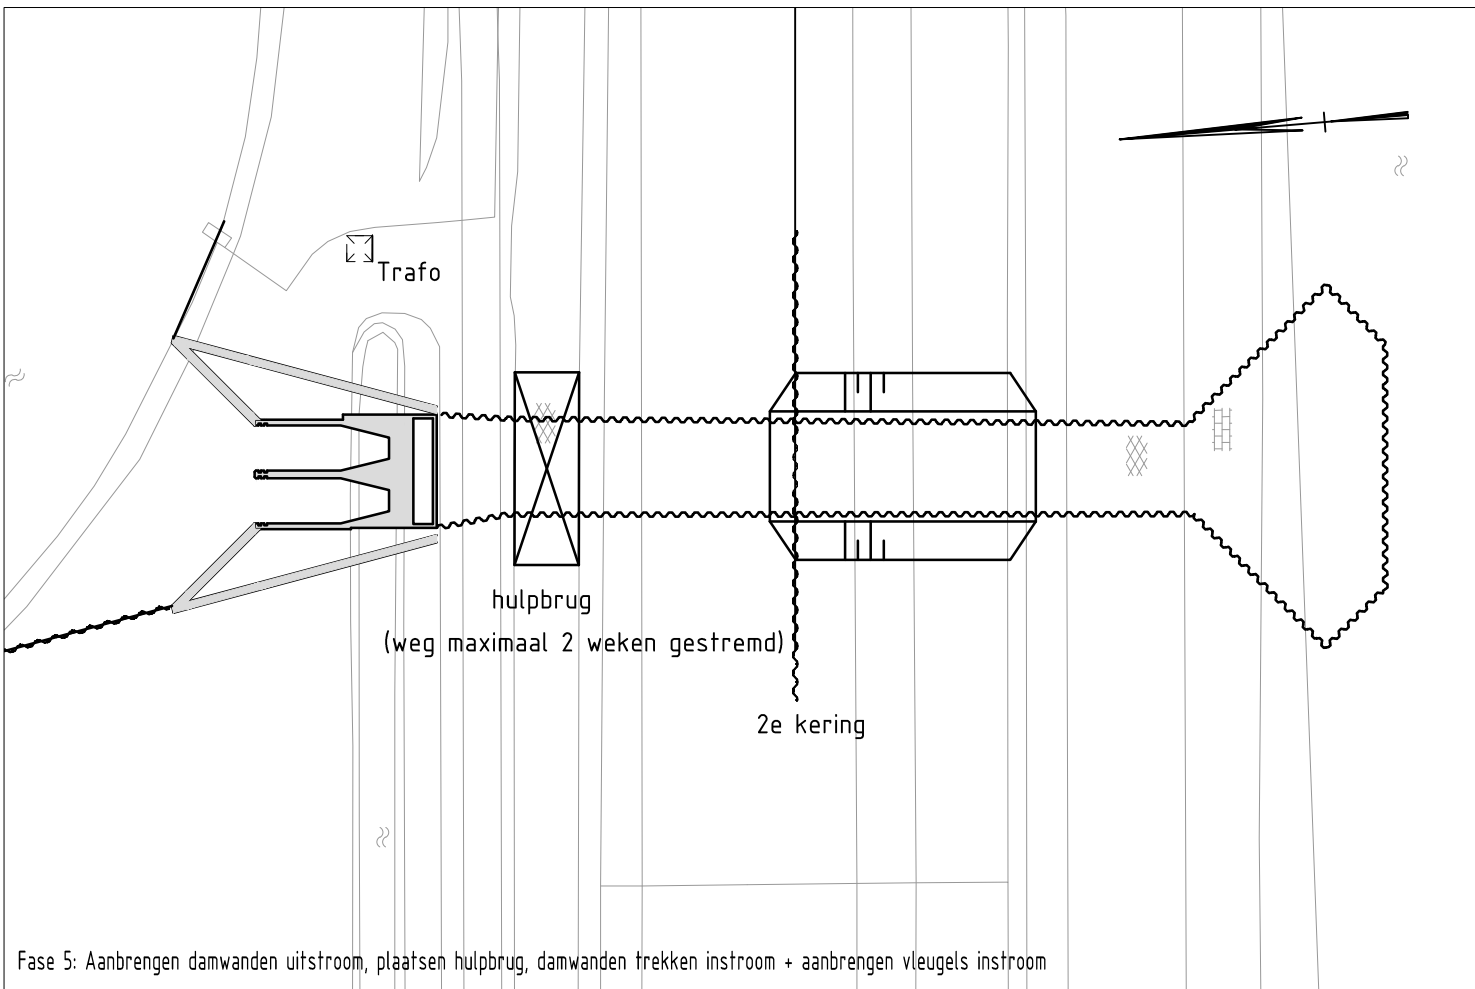


Fase 5: Aanbrengen damwanden uitstroom, plaatsen hulpbrug, damwanden trekken instroom + aanbrengen vleugels instroom

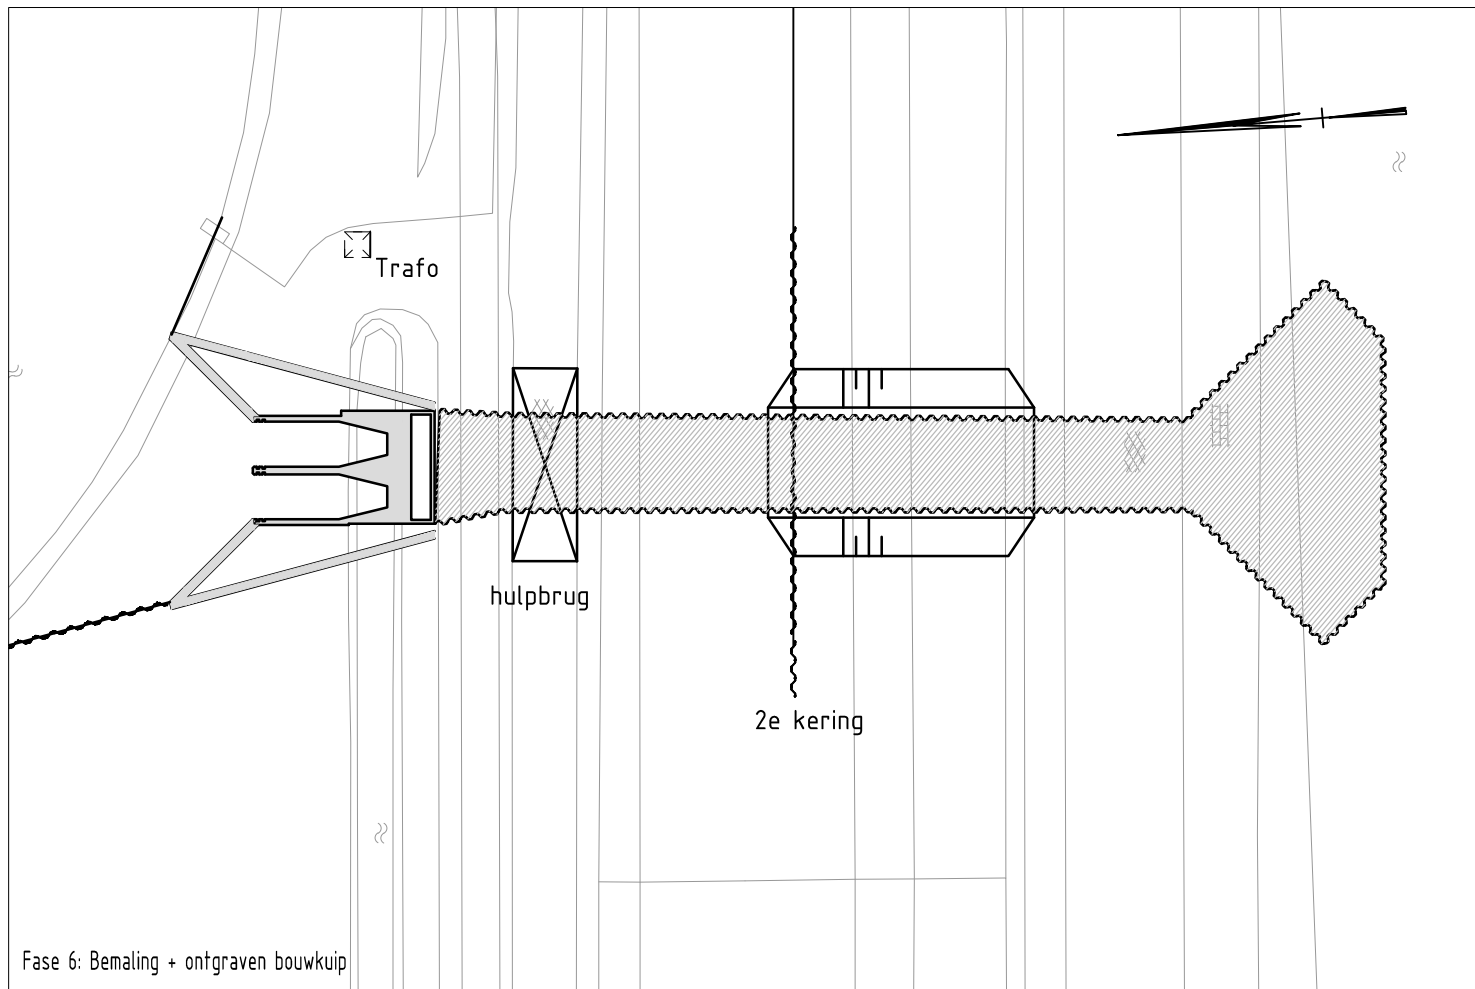


Fase 6: Bemaling + ontgraven bouwkuip

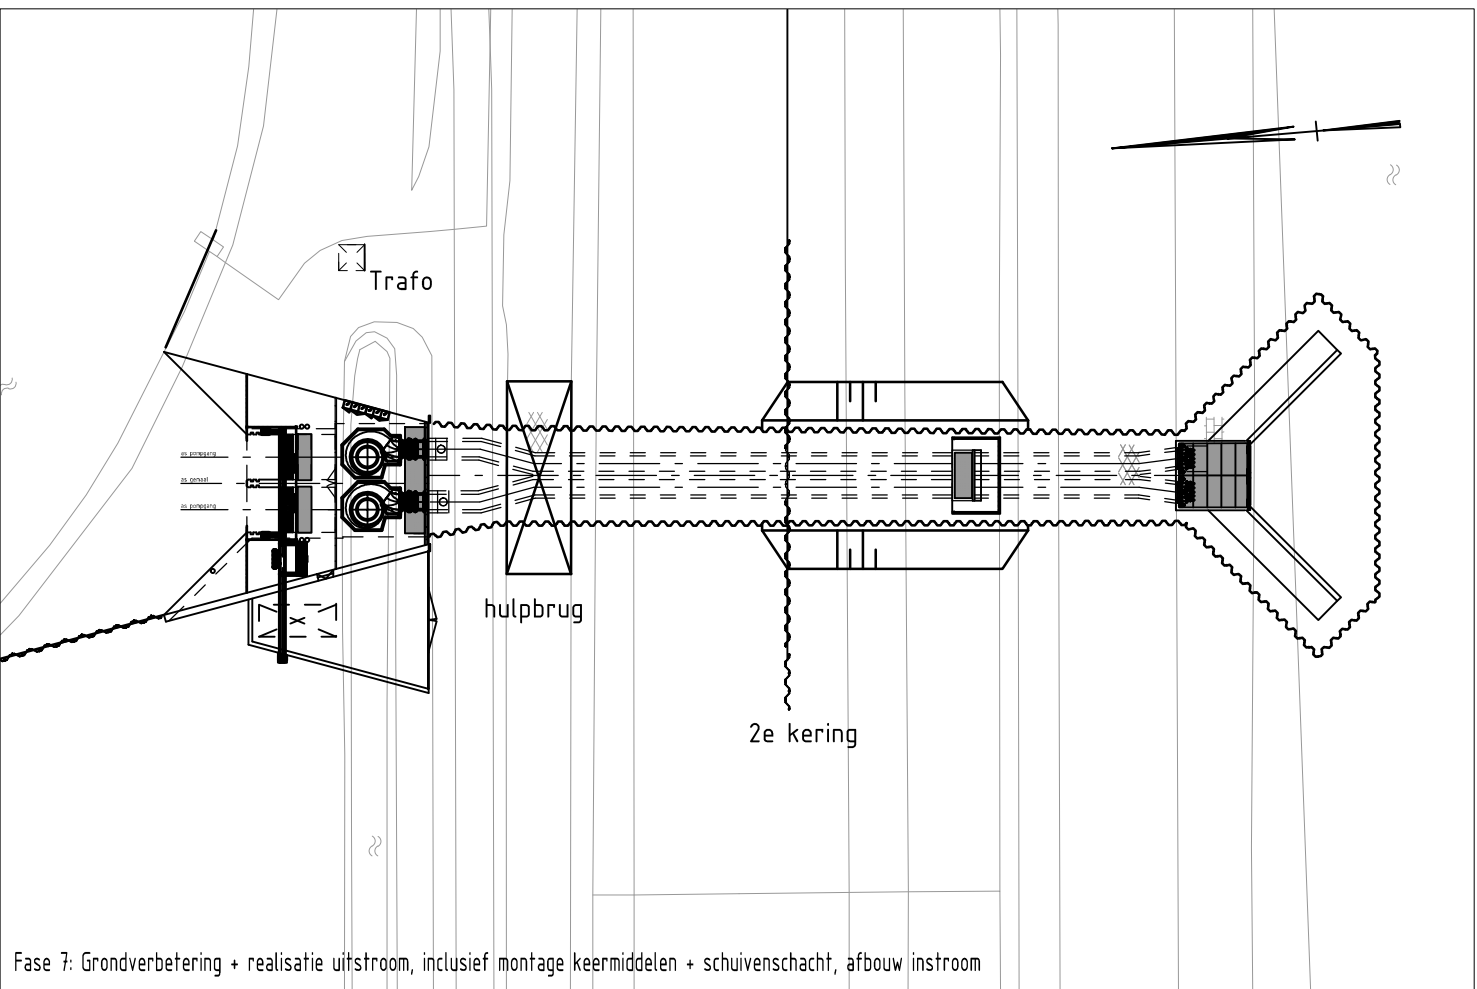


Fase 7: Grondverbetering + realisatie uitstroom, inclusief montage keermiddelen + schuivenschacht, afbouw instroom

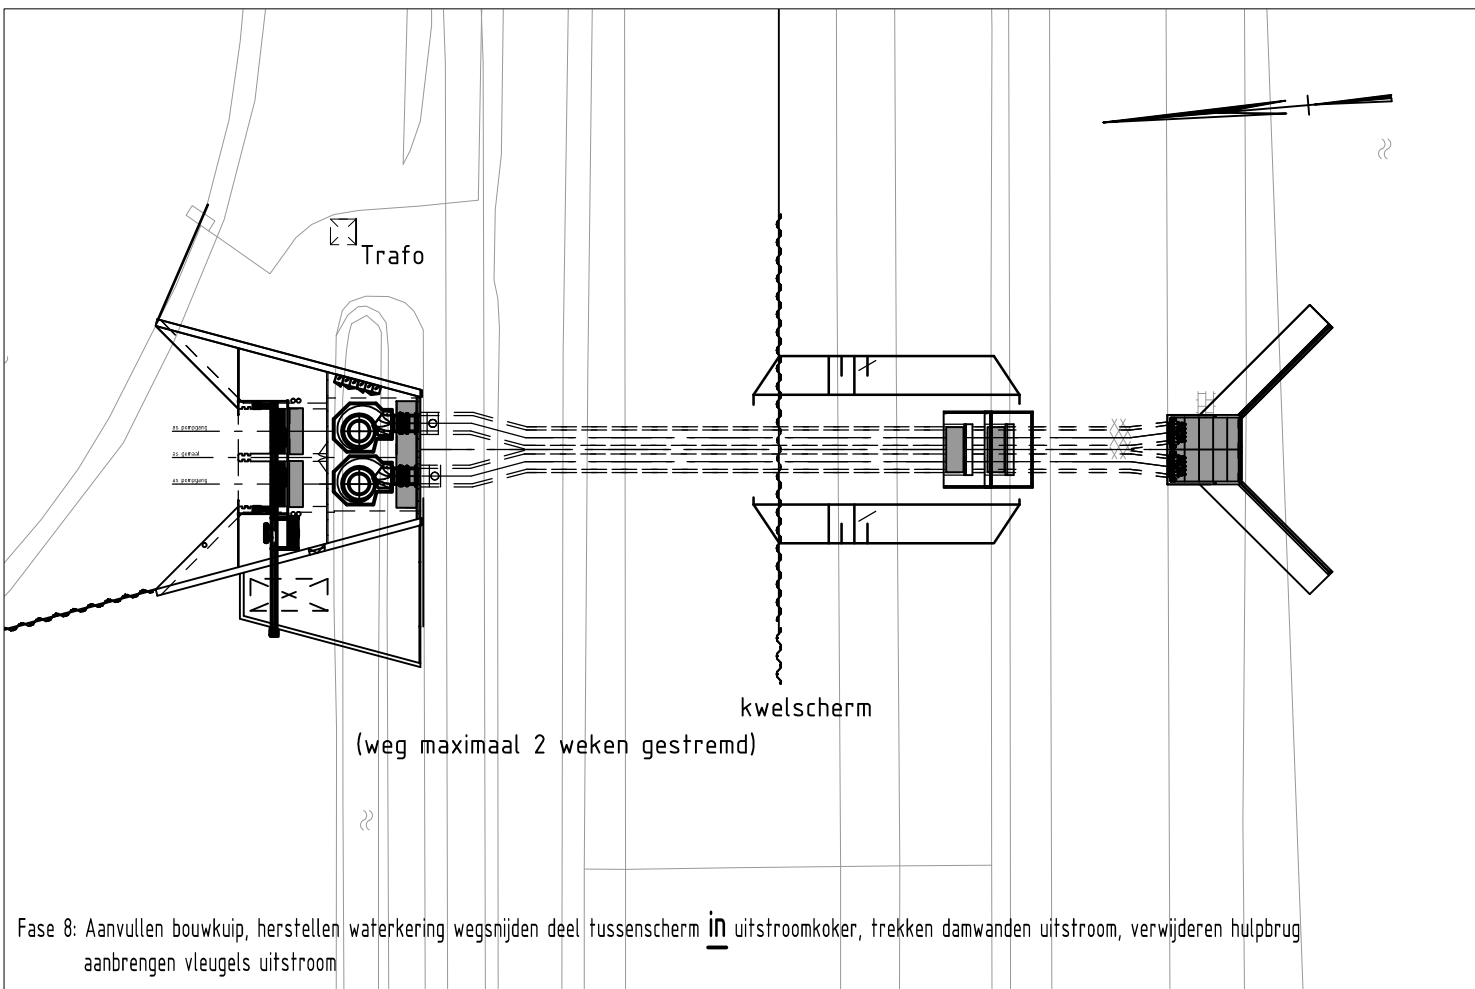


Fase 8: Aanvullen bouwkuip, herstellen waterkering wegsnijden deel tussenscherm in uitstroomkoker, trekken damwanden uitstroom, verwijderen hulpbrug, aanbrengen vleugels uitstroom

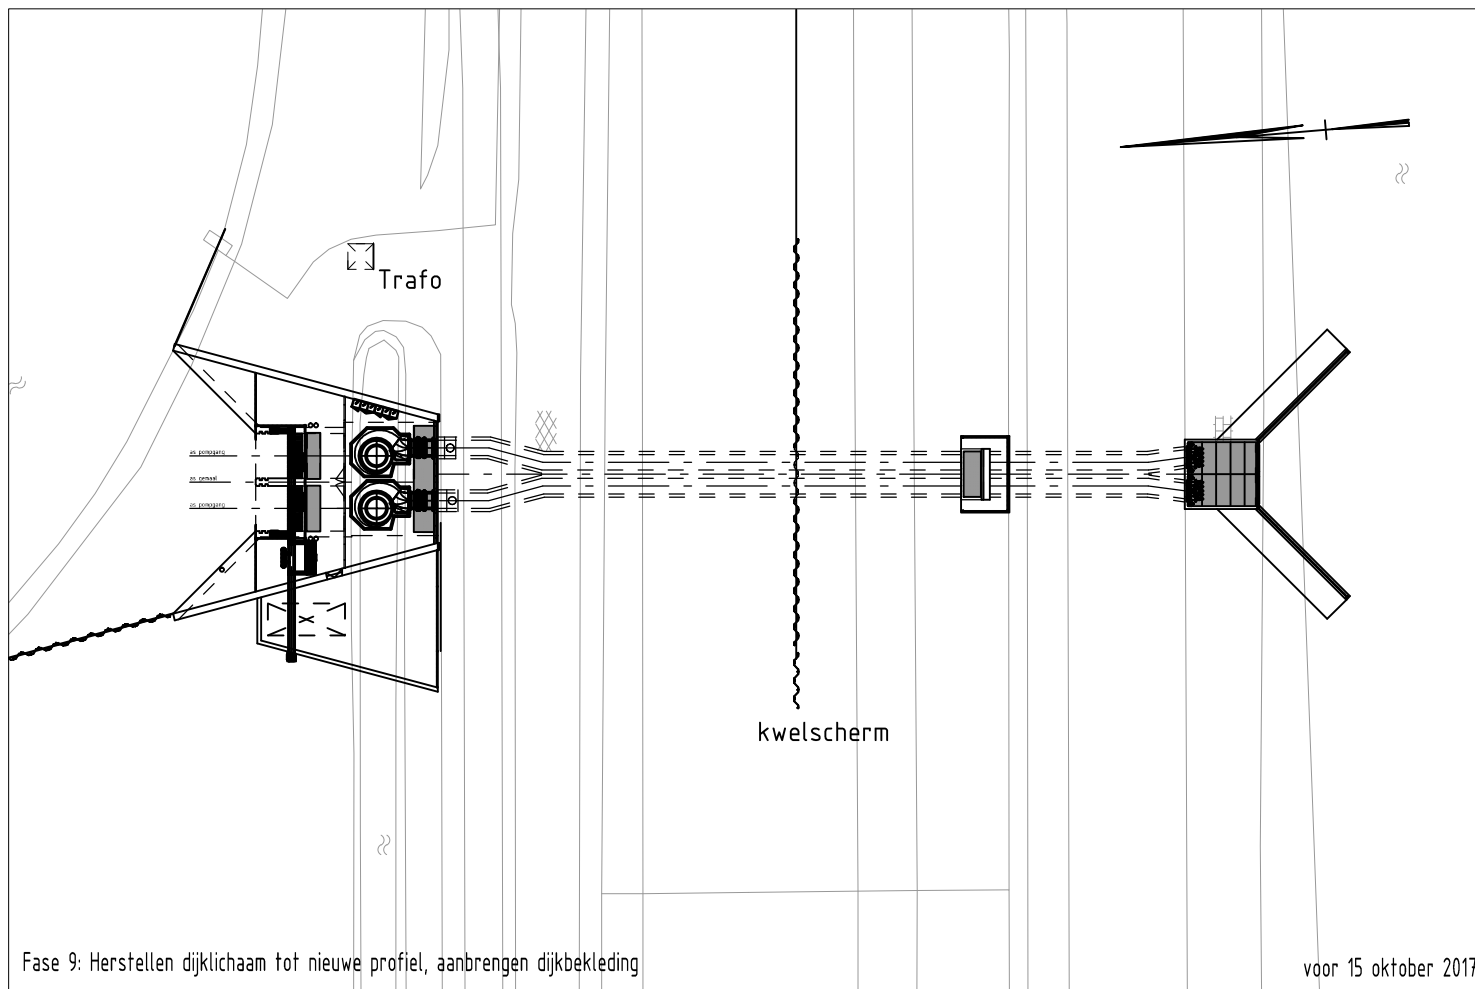

Fase 9: Herstellen dijklichaam tot nieuwe profiel, aanbrengen dijkbedekking voor 15 oktober 2017

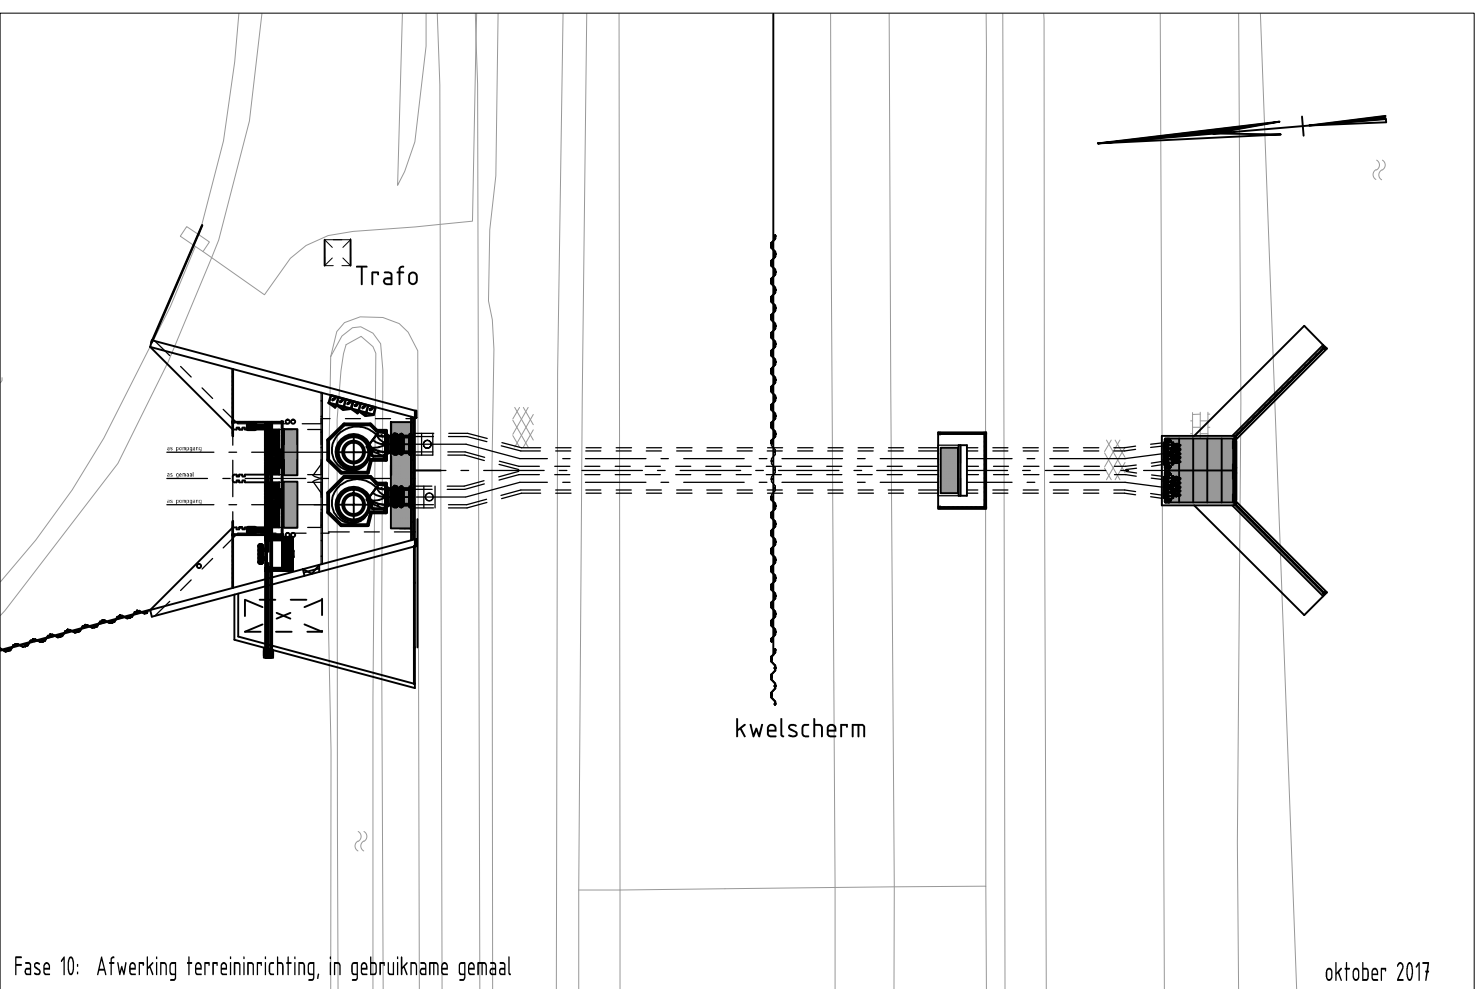

Fase 10: Afwerking terreininrichting, in gebruikname gemaal oktober 2017

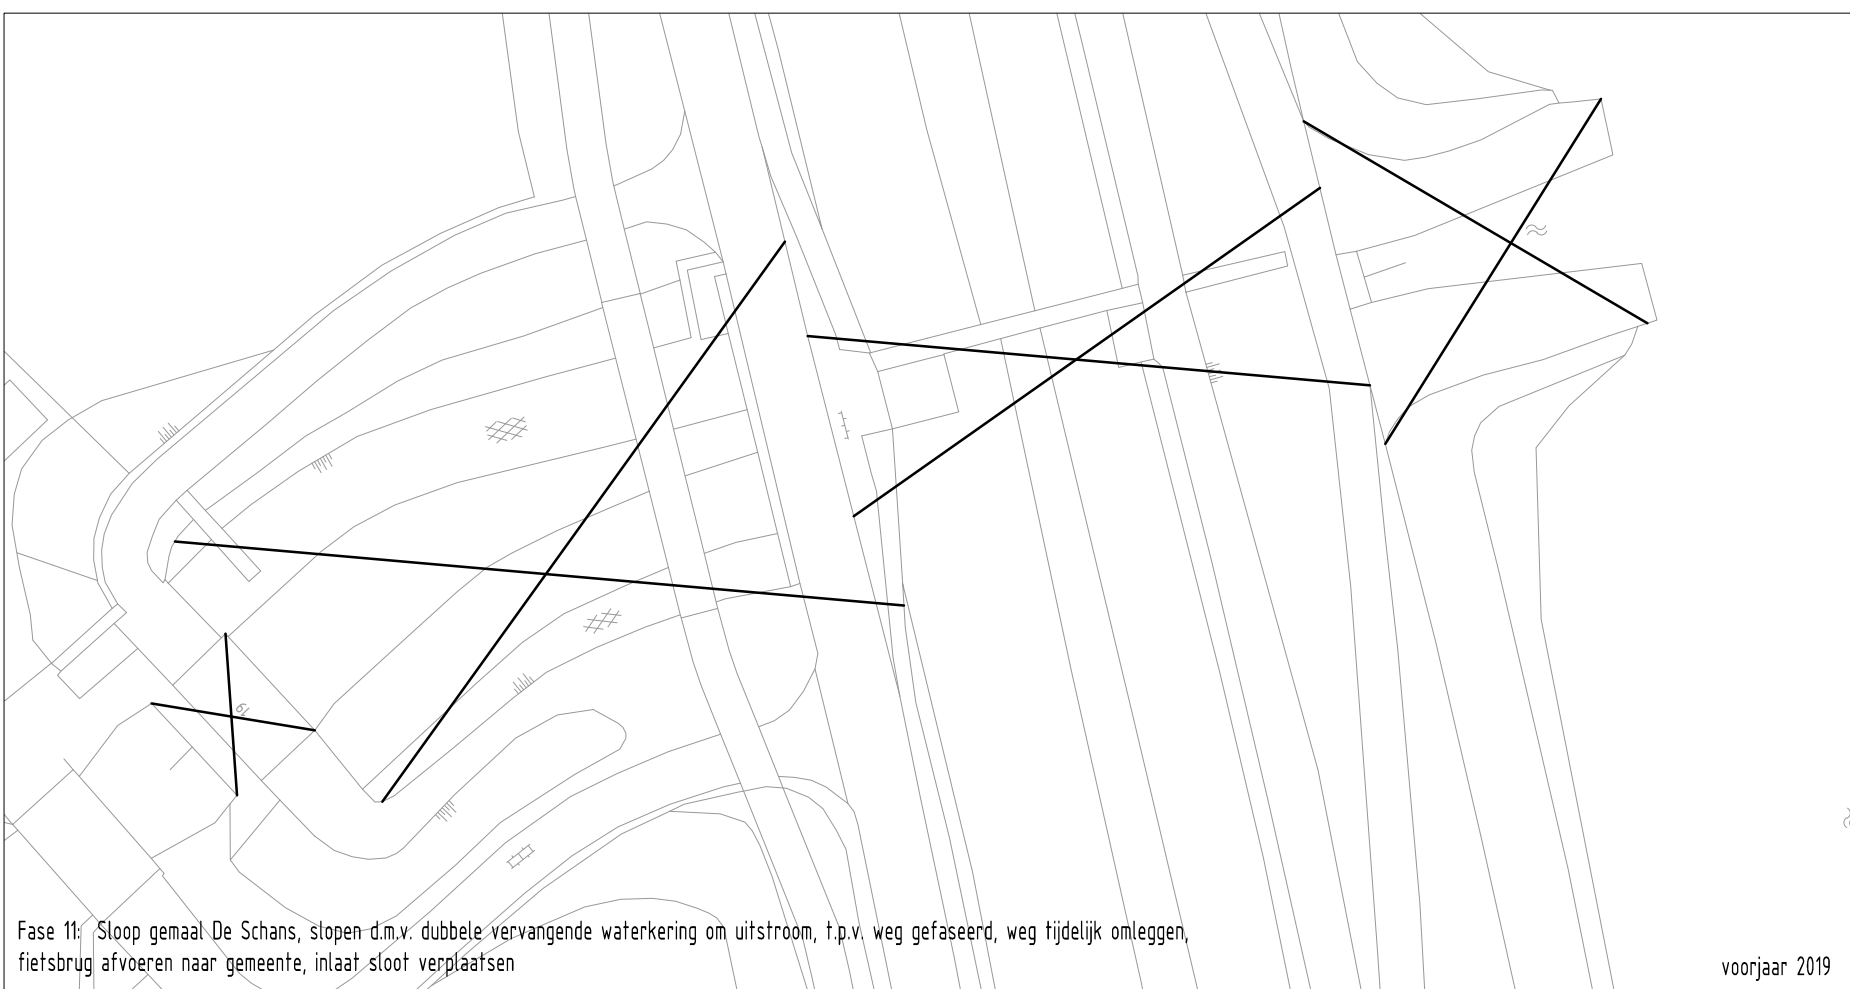

Fase 11: Sloop gemaal De Schans, stopen d.m.v. dubbele vervangende waterkering om uitstroom, t.p.v. weg gefaseerd, weg tijdelijk ontlegeren, fietsbrug afvoeren naar gemeente, inlaat sloot verplaatsen voorjaar 2019

Geen TPI -> bestaande gemaal in gebruik houden

Gemeente Texel .txl
Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 1288067
kenmerk document: Bijlage 8/8
Burgemeester en Wethouders van Texel,
namens dezen, de manager Dienstverlening,
mevrouw W. Velner



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.0	4-12-2015	JL	BN	BN	Keerwand uitstroom (100% versie)
Revisie	Datum	Getekend	Gecontroleerd	Vrijgegeven	Wijzigingen

WIJZIGINGSBEHEER DOCUMENT HISTORIE

Opdrachtgever:  Provincie Noord-Holland Opdrachtgever:  Boskalis		Project: Dijkversterking Waddenzeedijk Texel Opdrachtgever: HHNK-HWBP Tekeningomschrijving: Gemaal De Schans DO-Fasering		Getek: JL Doc. Type: TEKENING Doc. Nr.: - Status: Definitief	
Geconfr: BN		ProjNr: -		Schaal: 1 : 500	
Vrijgave: BN		Tekeningnummer:		Blad: 1 / 1	
Datum: 4-12-2015		DWT 114K1 DO 4.08		Revisie: 2.0	
