


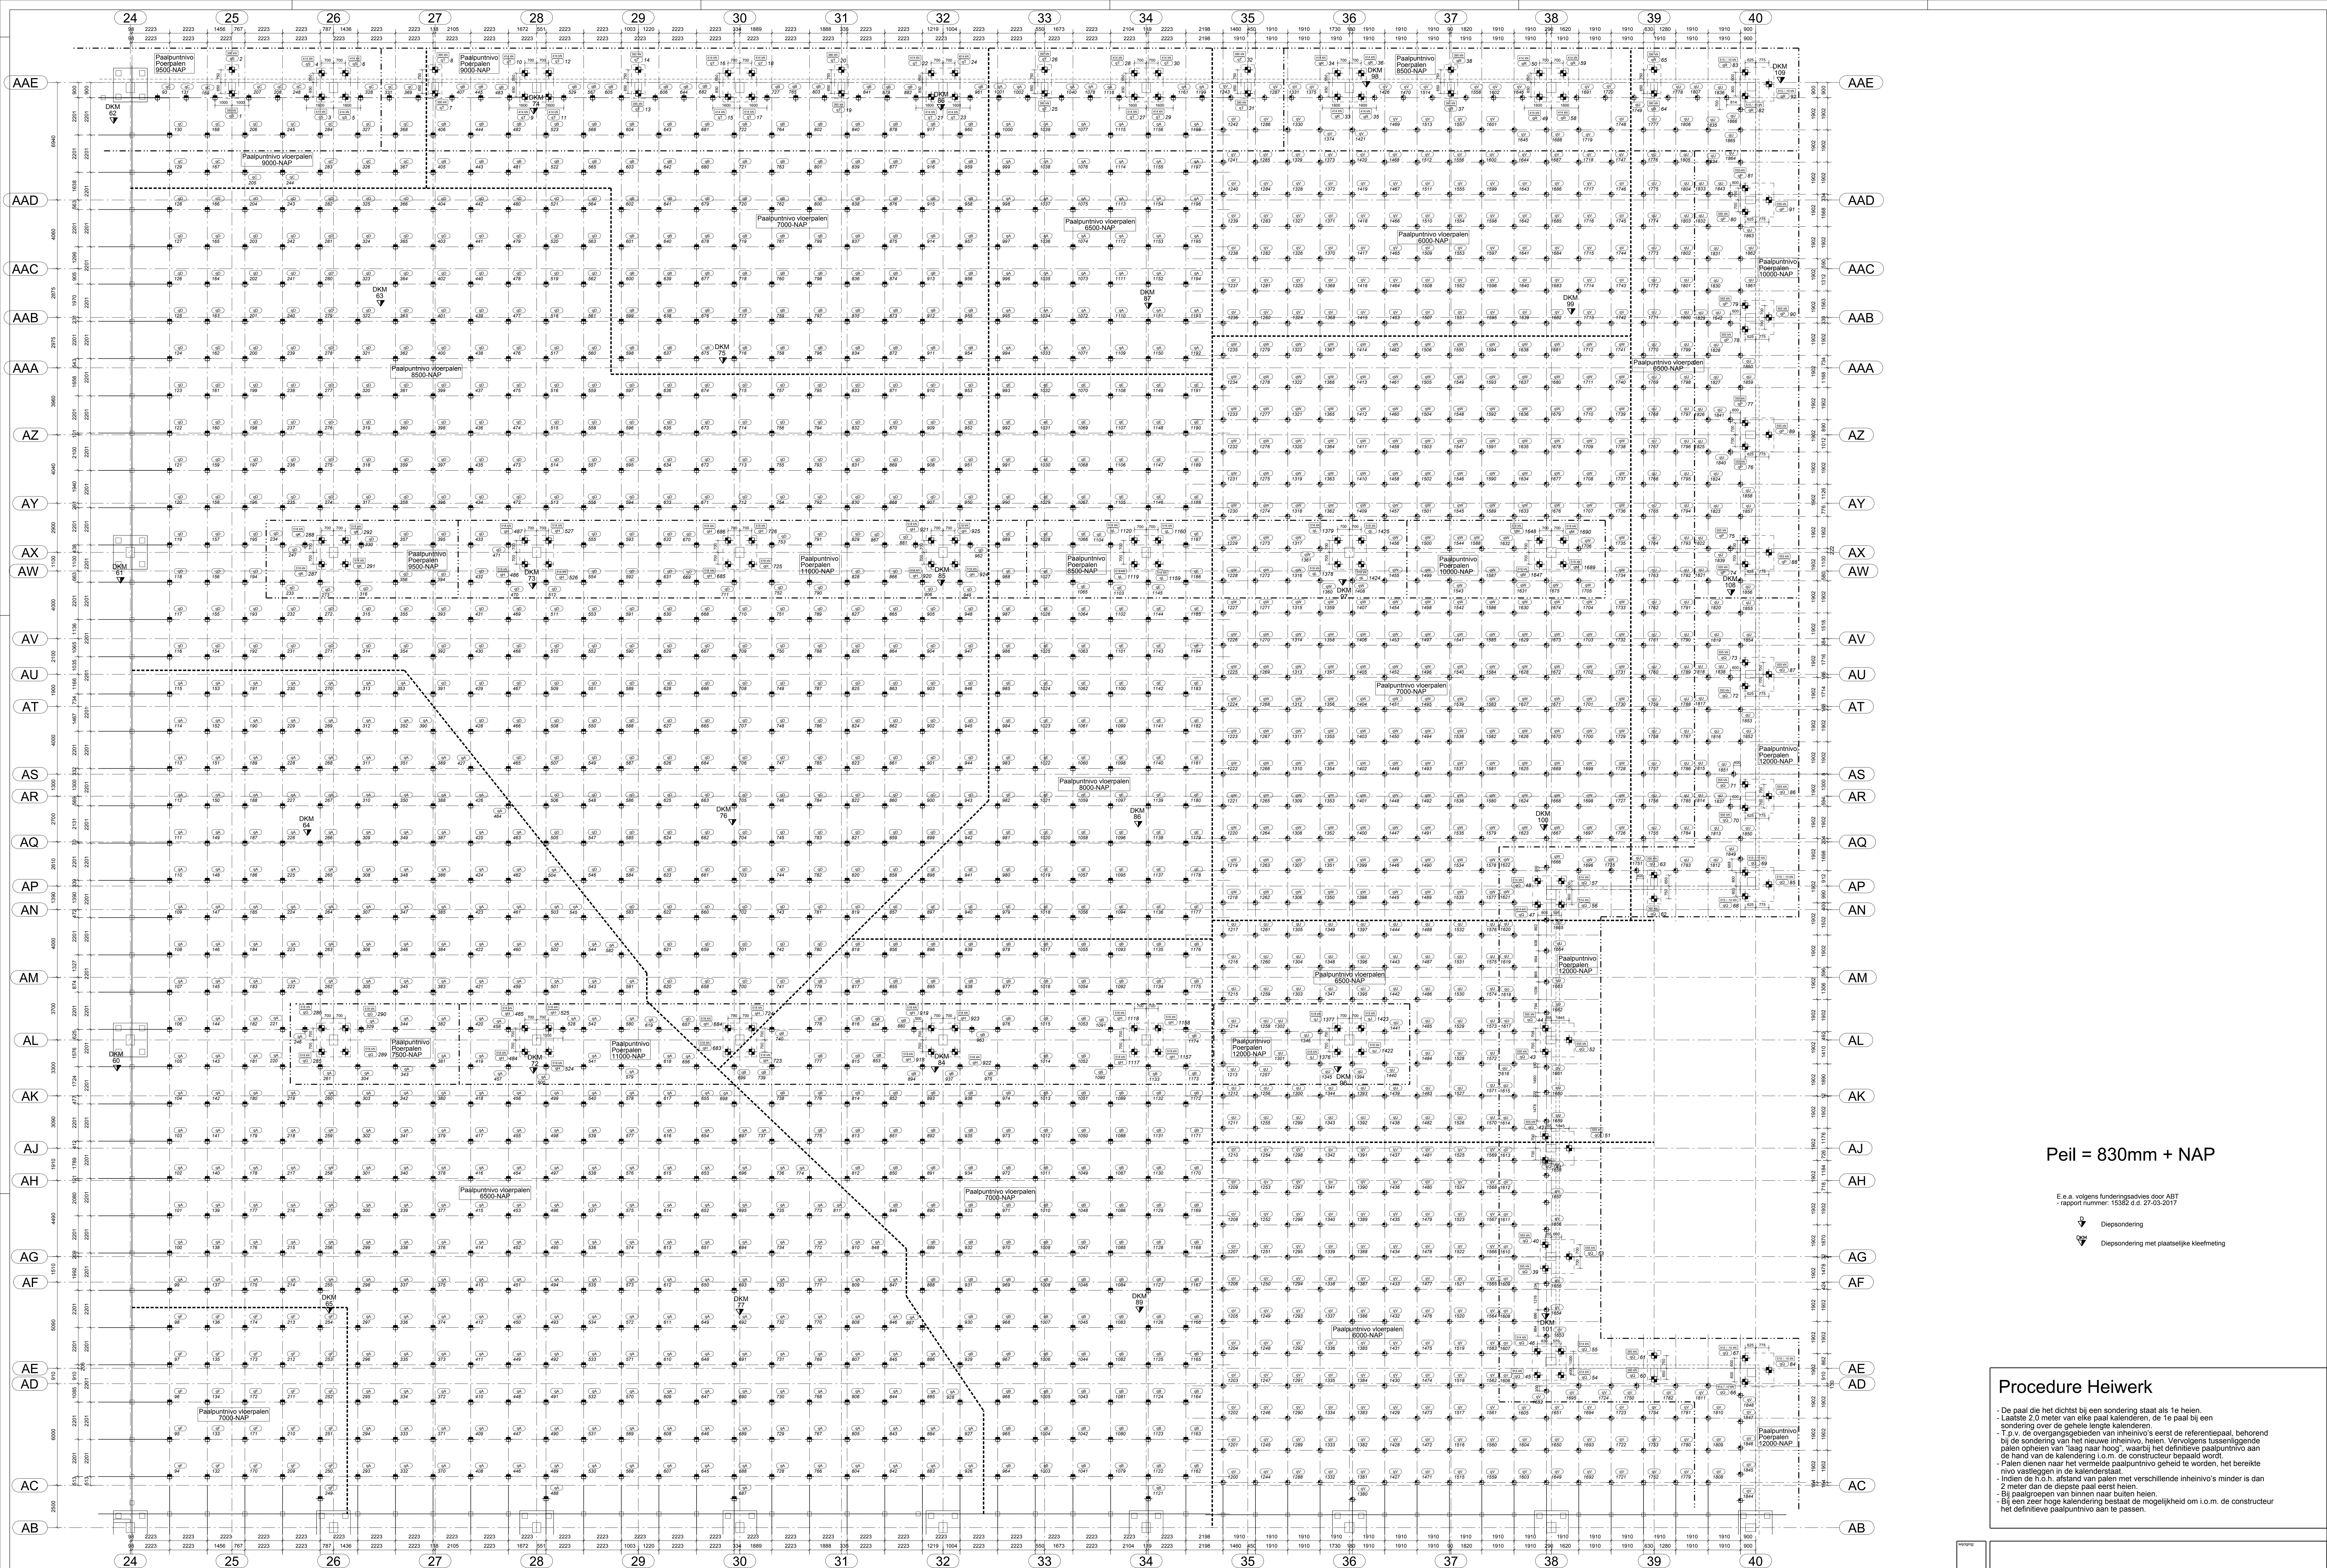

Peil = 830mm + NAP

E.e.a. volgens funderingsadvies door ABT
- rapport nummer: 15382 d.d. 27-03-2017

- Diepsondering
- Diepsondering met plaatselijke veldmeting

Procedure Heiwerk

- De paal die het dichtst bij een sondering staat als 1e heien.
- Laatste 2.0 meter van elke paal kalenderen, de 1e paal bij een sondering over de gehele lengte kalenderen.
- T.p.v. de overganggebieden van inheinv's eerst de referentiepaal, behorend bij de sondering van het nieuwe inheinv, heien. Vervolgens tussenliggende palen ophien van 'laag naar hoog', waarbij het definitieve paalpuntivo aan de hand van de kalendering i.o.m. de constructeur bepaald wordt.
- Palen dienen naar het vermeldde paalpuntivo geheid te worden, het bereikte nivo vastleggen in de kalendering.
- Indien de h.o.h. afstand van palen met verschillende inheinv's minder is dan 2 meter dan de diepte paal eerst heien.
- Bij paalgroepen van binnen naar buiten heien.
- Bij een zeer hoge kalendering bestaat de mogelijkheid om i.o.m. de constructeur het definitieve paalpuntivo aan te passen.

Prefab heipalen		Paalmaatstanden doorgeven aan de constructeur																			
Symbol		220*220	220*220	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320
Afmeting (mm)		220*220	220*220	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320
Paalnummer/letter	qV	qW	qA	qB	qC	qD	qE	qF	qG	qH	qI	qJ	qK	qL	qM	qP	qQ	qR	qS	qT	
Inheinv t.o.v. N.A.P. (in m)	-4.500	-6.000	-7.000	-8.500	-9.000	-8.500	-7.500	-7.500	-11.000	-12.000	-9.500	-8.500	-10.000	-10.000	-12.000	-8.500	-8.500	-9.500	-9.000	-9.000	
Inheinv t.o.v. Peil (in m)	-7.400	-8.900	-7.400	-7.900	-8.900	-8.400	-8.400	-11.900	-12.900	-10.400	-9.400	-8.400	-10.900	-10.900	-12.900	-8.400	-8.400	-9.400	-8.900	-8.900	
o.k. fundering / vloer	-0.190	-0.190	-0.190	-0.190	-0.190	-0.190	-0.190	-0.190	-0.800	-0.800	-0.800	-0.800	-0.800	-0.800	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
Afhakhoogte t.o.v. Peil (in m)	-0.230	-0.230	-0.230	-0.230	-0.230	-0.230	-0.230	-0.230	-0.780	-0.780	-0.780	-0.780	-0.780	-0.780	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	
Steklengte (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Paalsteig t/m stekken (in mm)	7170	6070	7670	9670	9170	8770	8170	8120	11620	12620	10120	9120	10820	10180	12180	8990	8990	9190	9190	9190	
Bestelsteig (mm)	7250	6750	7750	7250	7750	9750	9250	8250	11750	12750	10250	9250	10750	10250	12250	8750	8750	9250	9250	9250	
F.d.druk.max (kN) =	220	220	220	300	300	300	300	300	518	518	518	518	518	518	555	555	515	414	414	414	
F.d.trek.max (kN) =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0	0	0	
Kopwaaiering	177	249	229	366	232	23	326	95	26	4	28	4	4	8	4	12	33	15	6	26	
Aantal	Totaal aantal palen: 1866 stuks																				

Onderbouw
Palenplan Fase 2 as AC t/m AAE en 24 t/m 40
Inter-Sprint beheer

Nieuwbouw Bedrijfsal DB 27

HERCUTON
OP VOORSPRONG MET BETON

TOEWIJSLAGER 2, 525 RK NIEUWKUUR
Postbus 67, 5200 AB Vrijern
Telefoon +31 (0)86-2053450
Fax +31 (0)86-2053450
Internet: www.hercuton.nl
E-mail: info@hercuton.nl

12084
F-01f
VOORLOPIG

07-06-2017
1:115
Hennu
C. Schat
A. Wouters
