

**ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK**

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

**INSPECTIERAPPORT****Pagina 1 van 3****Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110500127**

Opdrachtgever Pongers  
Contactpersoon Dhr JH Pongers  
Projectnr. 105202 Werkplannr. 105202  
Locatie adres Dorpsstraat 20 te Ijzendoorn

Datum 13-05-2011 Naam analist T.Koetse  
Tijdsduur Aankomst 12.00 Vertrek 13.30 Tijd op locatie 1 uur 30 min  
Werkzaamheden Visuele inspectie na asbestsanering Buitensituatie  
Weer Bewolkt zon T (°C) 19

**Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)**

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja van de Poel 08.167/107  
Omschrijving saneringswerkzaamheden: Het saneren van asbesthoudend Pilaren ,bigbag, golfplaten en vlakke plaat als zwerfasbest

Locatie saneringswerkzaamheden: zwerfasbest ligt los op het terrein ca. 1000m<sup>2</sup> en de pilaren stonden in de voormalige garage. Achter de garage stond een bigbag met asbesthoudend materiaal

Wat is er verwijderd: 1 big-bag met materiaal en ca. 1 m<sup>3</sup> aan losse stukken materiaal en 6.5 m ac-buis aan verloren bekisting in voormalige garage

Asbestsoort (gew%): golf plaat 10-15% chrysotiel vlakke plaat 2-5% vlakke plaat 15-30% amosiet

Hechtgebonden en niet hecht gebonden

Het inspectiegebied is +/- 1000 m<sup>2</sup>

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

|                                                                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Containment aanwezig?                                                                                               | O ja, m <sup>2</sup> x nee |
| Is er een sloopvergunning aanwezig                                                                                  | X ja O nee                 |
| Voldoende verlichting?                                                                                              | X ja O nee                 |
| Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?                                                                          | O ja X nee                 |
| Is de ruimte droog?                                                                                                 | X ja O nee                 |
| Is de ruimte stofvrij?                                                                                              | O ja X nee                 |
| Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?                                                                 | O ja X nee                 |
| Zijn oppervlakken gefixeerd?                                                                                        | O ja X nee                 |
| Werkplan in overeenstemming met te inspecteren object                                                               | X ja O nee                 |
| Opmerkingen: niet stofvrij is geen containment . De toplaag is geïnspecteerd achter op het terrein niet in de bodem |                            |

| Locatie/bouwdeel                                                                      | Aanwezig   | Resultaat |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Plafond (constructiedelen)                                                            | X ja O nee | +         |
| Kabelgoten doorvoeringen                                                              | O ja x nee |           |
| Ventilatiekanalen                                                                     | O ja x nee |           |
| Buizen                                                                                | O ja x nee |           |
| Verwarmingselementen                                                                  | O ja x nee |           |
| Kozijnen                                                                              | O ja x nee |           |
| Plinten                                                                               | O ja x nee |           |
| Vloer                                                                                 | X ja O nee | +         |
| Machines, installaties                                                                | O ja x nee |           |
| Overige, nl.                                                                          | O ja x nee |           |
| Opmerkingen: Door de grootte van het te inspecteren gebied is in 2 segmenten verdeeld |            |           |

+ = direct in orde bevonden;

+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;

A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



**ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK**

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

**INSPECTIERAPPORT**

**Pagina 2 van 3**

**Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110500127**

| Locatie/bouwdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultaat constructiedeel | Resultaat aangelegen delen | Resultaat ondergelegen oppervlak | Opmerkingen en codering genomen kleeft monsters |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Terrein segment 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                         | +                          | +                                | --                                              |
| garage segment 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                         | +                          | +                                | --                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |                                  |                                                 |
| Niet geïnspecteerde delen: Achter de garage stond een bigbag deze is in zijn totaal verwijderd .Het omliggend stuk terrein is visueel beoordeeld op de toplaag. De begroeiing op het terrein geeft een visuele beperking. Teven is er puinverharding aanwezig als zijnde pad dit valt ook buiten deze vrijgave. later zal er een bodemsanering uitgevoerd worden van te inspecteren gebied waarbij de toplaag ca. 0,5 m wordt afgegraven |                           |                            |                                  |                                                 |

**Conclusie visuele inspectie**

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

T. Koetse

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

J Lubbers



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. I 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK


Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

## INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110500127

Globale situatietekening

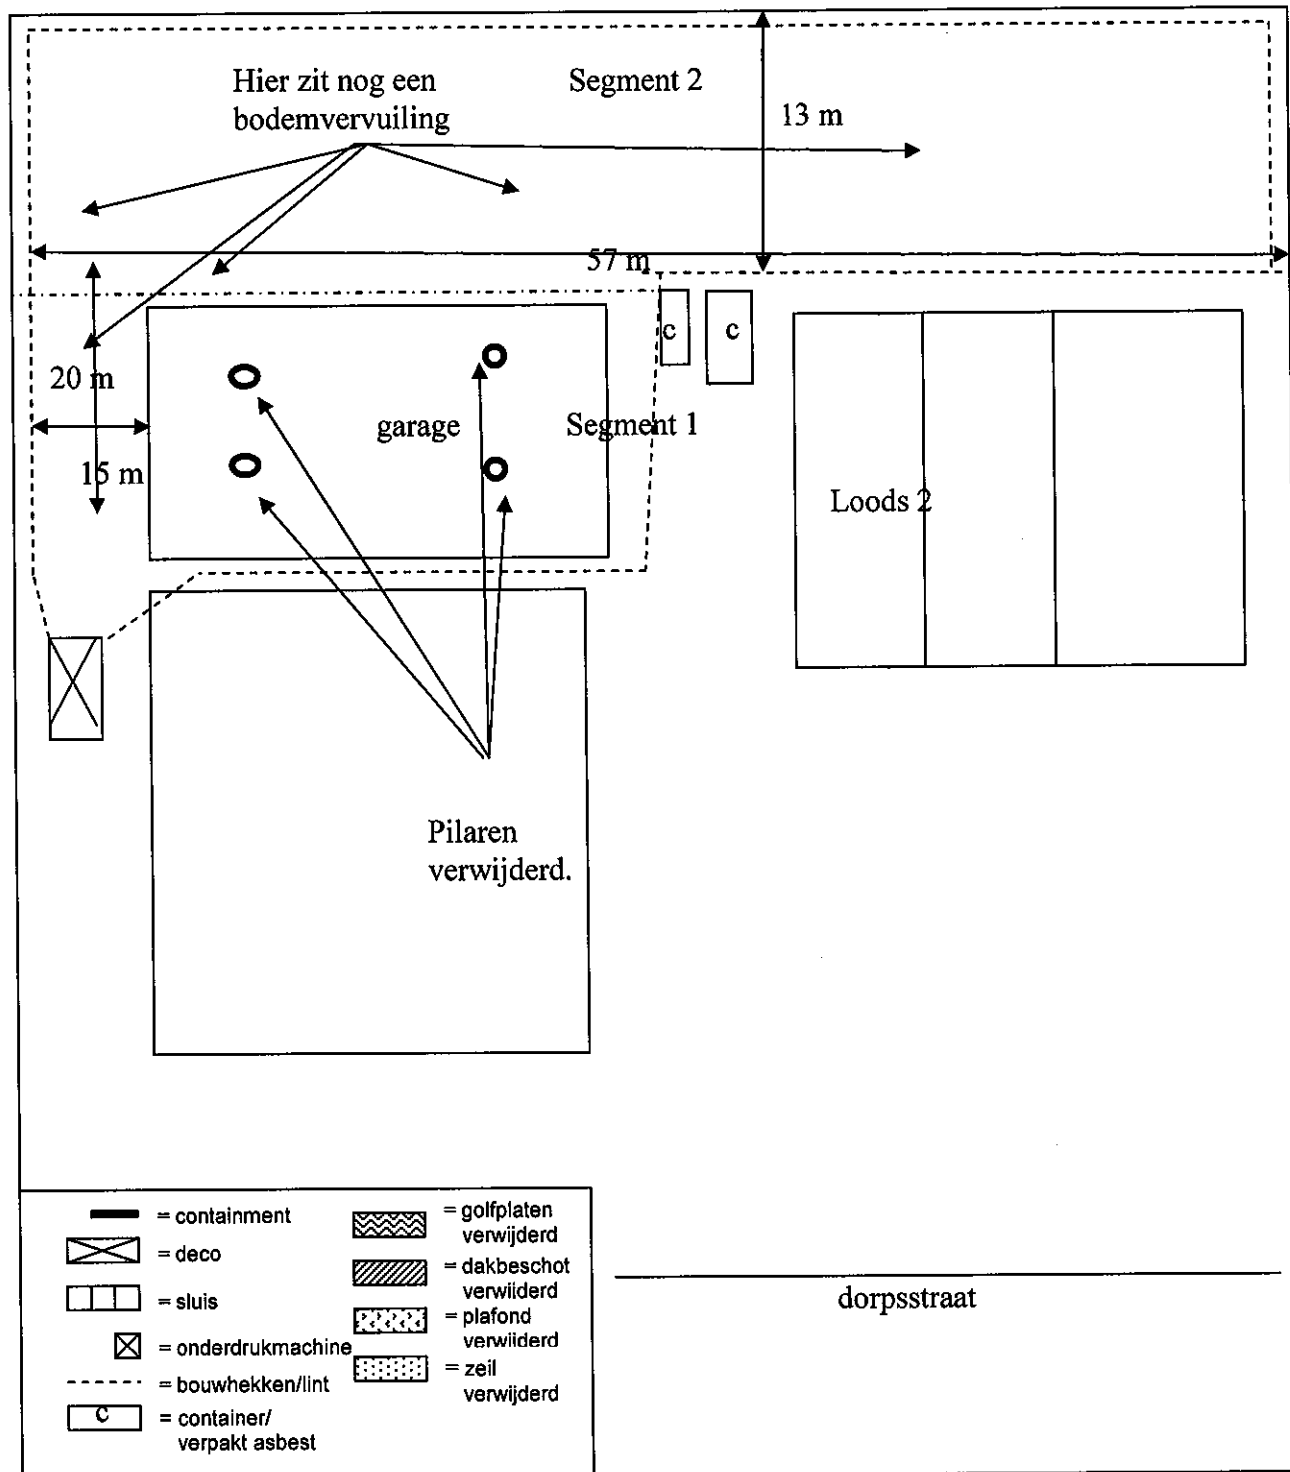

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

## INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110500127

Opdrachtgever Pongers  
Contactpersoon Dhr JH Pongers  
Projectnr. 105202 Werkplannr. 105202  
Locatie adres Dorpsstraat 20 te Ijzendoorn

|               |                                     |                 |              |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Datum         | 13-05-2011                          | Naam analist    | T.Koetse     |
| Tijdsduur     | Aankomst 12.00 Vertrek 13.30        | Tijd op locatie | 1 uur 30 min |
| Werkzaamheden | Visuele inspectie na asbestsanering | Buitensituatie  |              |
| Weer          | Bewolkt zon                         | T (°C)          | 19           |

### Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja van de Poel 08.167/107  
Omschrijving saneringswerkzaamheden: Het saneren van asbesthoudend Pilaren ,bigbag, golfplaten en vlakke plaat als zwerfasbest

Locatie saneringswerkzaamheden: zwerfasbest ligt los op het terrein ca. 1000m<sup>2</sup> en de pilaren stonden in de voormalige garage. Achter de garage stond een bigbag met asbesthoudend materiaal

Wat is er verwijderd: 1 big-bag met materiaal en ca. 1 m<sup>3</sup> aan losse stukken materiaal en 6.5 m ac-buis aan verloren bekisting in voormalige garage

Asbestsoort (gew%): golf plaat 10-15% chrysotiel vlakke plaat 2-5% vlakke plaat 15-30% amosiet

Hechtgebonden en niet hecht gebonden

Het inspectiegebied is +/- 1000 m<sup>2</sup>

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

|                                                                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Containment aanwezig?                                                                                               | O ja, m <sup>2</sup> x nee |
| Is er een sloopvergunning aanwezig                                                                                  | X ja O nee                 |
| Voldoende verlichting?                                                                                              | X ja O nee                 |
| Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?                                                                          | O ja X nee                 |
| Is de ruimte droog?                                                                                                 | X ja O nee                 |
| Is de ruimte stofvrij?                                                                                              | O ja X nee                 |
| Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?                                                                 | O ja X nee                 |
| Zijn oppervlakken gefixeerd?                                                                                        | O ja X nee                 |
| Werkplan in overeenstemming met te inspecteren object                                                               | X ja O nee                 |
| Opmerkingen: niet stofvrij is geen containment . De toplaag is geïnspecteerd achter op het terrein niet in de bodem |                            |

| Locatie/bouwdeel                                                                      | Aanwezig   | Resultaat |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Plafond (constructiedelen)                                                            | X ja O nee | +         |
| Kabelgoten doorvoeringen                                                              | O ja x nee |           |
| Ventilatiekanalen                                                                     | O ja x nee |           |
| Buizen                                                                                | O ja x nee |           |
| Verwarmingselementen                                                                  | O ja x nee |           |
| Kozijnen                                                                              | O ja x nee |           |
| Plinten                                                                               | O ja x nee |           |
| Vloer                                                                                 | X ja O nee | +         |
| Machines, installaties                                                                | O ja x nee |           |
| Overige, nl.                                                                          | O ja x nee |           |
| Opmerkingen: Door de grootte van het te inspecteren gebied is in 2 segmenten verdeeld |            |           |

+ = direct in orde bevonden;

+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;

A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RVA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. I 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110500127

| Locatie/bouwdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultaat constructiedeel | Resultaat aangelegen delen | Resultaat ondergelegen oppervlak | Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Terrein segment 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                         | +                          | +                                | --                                            |
| garage segment 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                         | +                          | +                                | --                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |                                  |                                               |
| Niet geïnspecteerde delen: Achter de garage stond een bigbag deze is in zijn totaal verwijderd .Het omliggend stuk terrein is visueel beoordeeld op de toplaag. De begroeiing op het terrein geeft een visuele beperking. Teven is er puinverharding aanwezig als zijnde pad dit valt ook buiten deze vrijgave. later zal er een bodemsanering uitgevoerd worden van te inspecteren gebied waarbij de toplaag ca. 0,5 m wordt afgegraven |                           |                            |                                  |                                               |

**Conclusie visuele inspectie**

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolwerkzaamheden.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

T. Koetse

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

J Lubbers



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. I 178 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK


Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

## INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110500127

Globale situatietekening

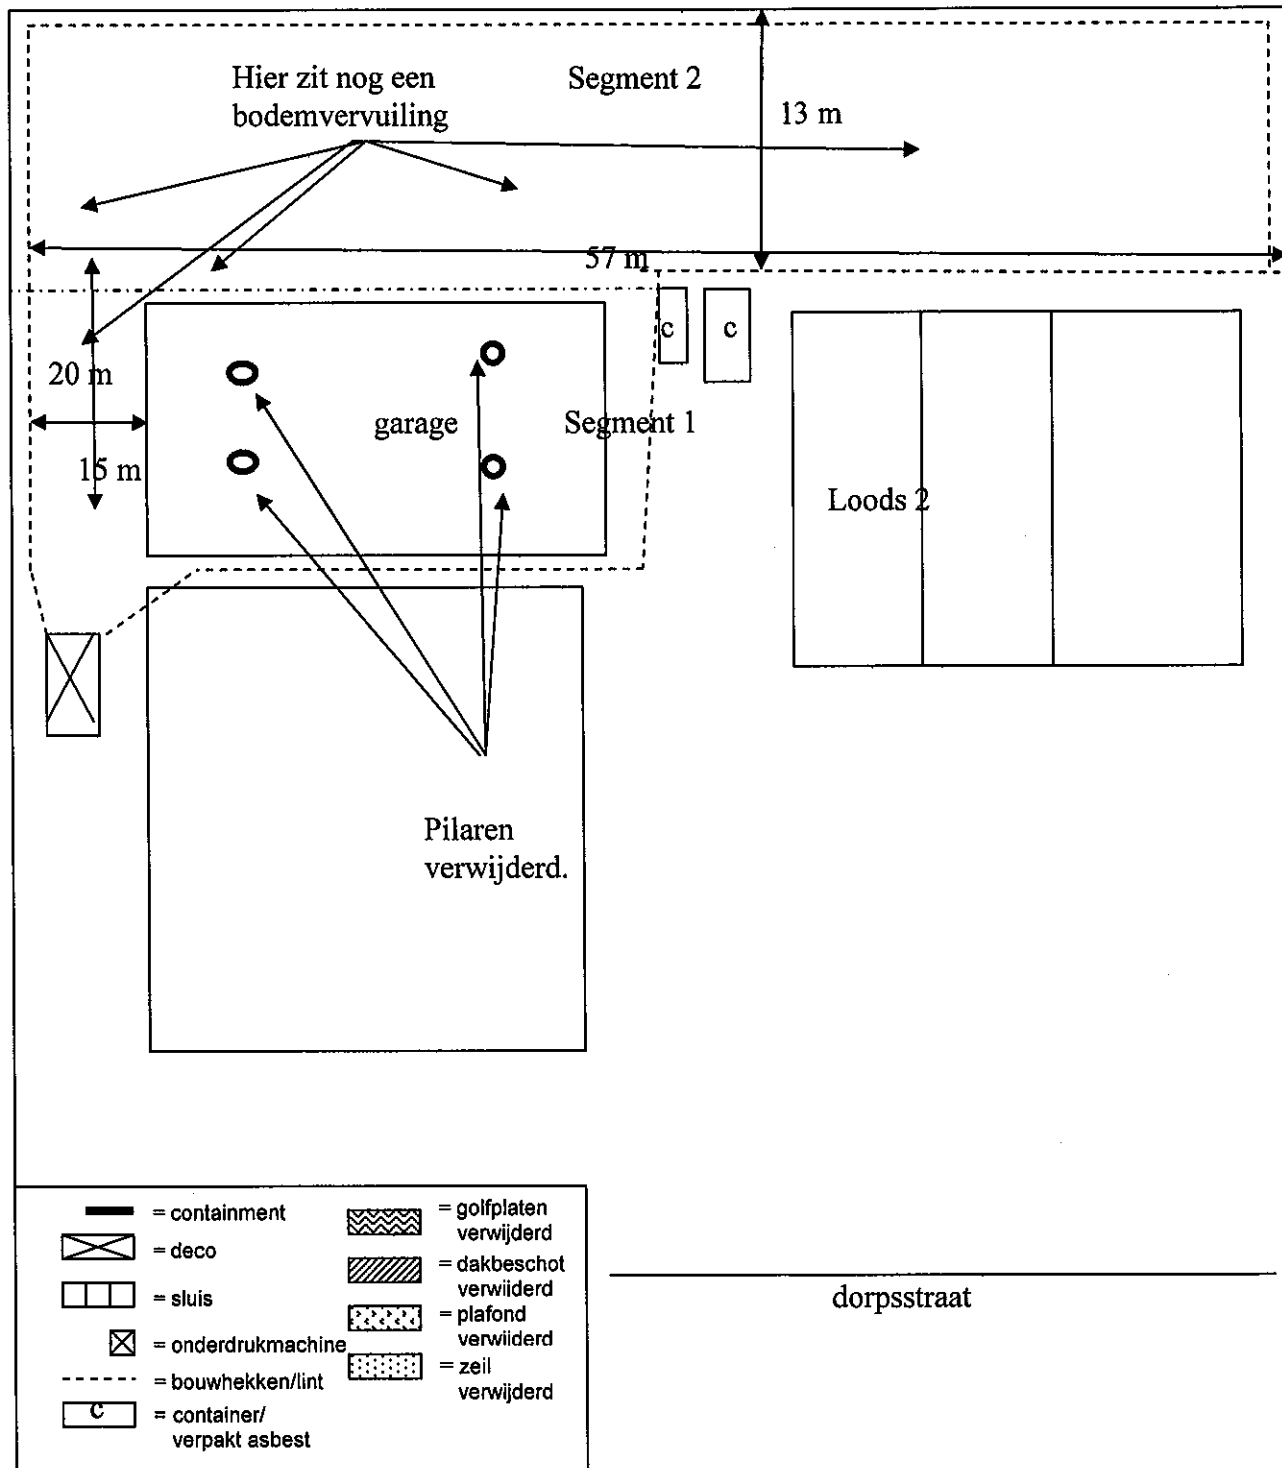

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

## INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A1105000

Opdrachtgever Pongers  
Contactpersoon Dhr JH Pongers  
Projectnr. 105202 Werkplannr. 105202  
Locatie adres Dorpsstraat 20 te IJzendoorn

Datum 06-05-2011 Naam analist T.Koetse  
Tijdsduur Aankomst 14.50 Vertrek 15.50 Tijd op locatie 1 uur  
Werkzaamheden Visuele inspectie na asbestsanering Buitensituatie  
Weer Bewolkt zon T (°C) 21

### Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja van de Poel 08.167/107

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Het saneren van asbesthoudend asfalt(dakleer) en vlakke plaat

Locatie saneringswerkzaamheden: Dakleer van het dak garage en vlakke plaat van dak loods 2.

Wat is er verwijderd: 170 m<sup>2</sup> asfalt(dakleer) en 80 m<sup>2</sup> vlakke plaat

Asbestsoort (gew%): dakleer 0.1-2% chrysotiel en vlakke plaat 10-15% chrysotiel

Hechtgebonden.

Het inspectiegebied is +/- 400 m<sup>2</sup>

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

|                                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Containment aanwezig?                                                                   | O ja, m <sup>2</sup> x nee |
| Is er een sloopvergunning aanwezig                                                      | X ja O nee                 |
| Voldoende verlichting?                                                                  | X ja O nee                 |
| Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?                                              | O ja X nee                 |
| Is de ruimte droog?                                                                     | X ja O nee                 |
| Is de ruimte stofvrij?                                                                  | O ja X nee                 |
| Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?                                     | O ja X nee                 |
| Zijn oppervlakken gefixeerd?                                                            | O ja X nee                 |
| Werkplan in overeenstemming met te inspecteren object                                   | X ja O nee                 |
| Opmerkingen: niet stofvrij is geen containment . dakleer is incl. dakplaten verwijderd. |                            |

| Locatie/bouwdeel                                                                      | Aanwezig   | Resultaat |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Plafond (constructiedelen)                                                            | X ja O nee | +         |
| Kabelgoten doorvoeringen                                                              | O ja x nee |           |
| Ventilatiekanalen                                                                     | O ja x nee |           |
| Buizen                                                                                | O ja x nee |           |
| Verwarmingselementen                                                                  | O ja x nee |           |
| Kozijnen                                                                              | O ja x nee |           |
| Plinten                                                                               | O ja x nee |           |
| Vloer                                                                                 | X ja O nee | +         |
| Machines, installaties                                                                | O ja x nee |           |
| Overige, nl.                                                                          | O ja x nee |           |
| Opmerkingen: Door de grootte van het te inspecteren gebied is in 2 segmenten verdeeld |            |           |

+ = direct in orde bevonden;

+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;

A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RVA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A1105030<sup>30</sup>

| Locatie/bouwdeel                                                                                                             | Resultaat constructiedeel | Resultaat aangelegen delen | Resultaat ondergelegen oppervlak | Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Garage segment 1                                                                                                             | +                         | +                          | +                                | --                                            |
| Loods 2 segment 2                                                                                                            | +                         | +                          | +                                | --                                            |
|                                                                                                                              |                           |                            |                                  |                                               |
| Niet geïnspecteerde delen: Achter de grage hoord de toplaag niet tot deze vrijgave wordt later een bodemsanering uitgevoerd. |                           |                            |                                  |                                               |

**Conclusie visuele inspectie**

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

T. Koetse

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

J Lubbers



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE





ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK


Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A1105000

Globale situatietekening

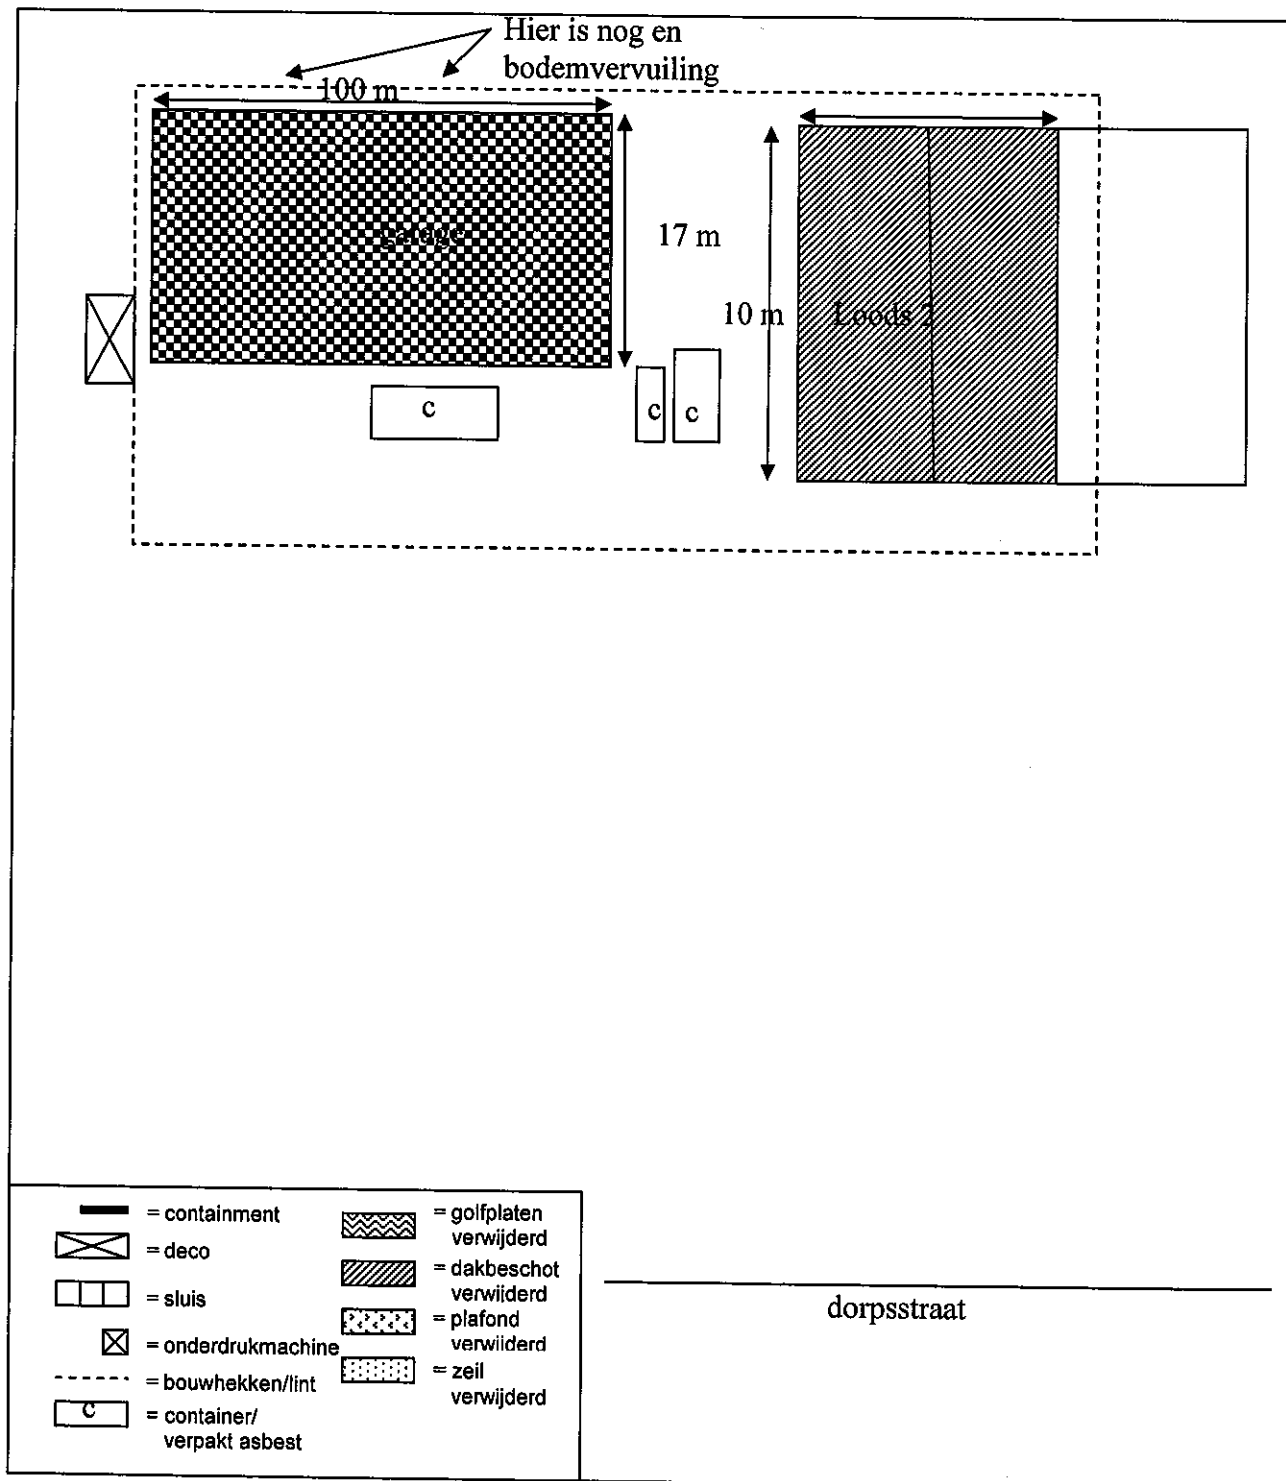

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RVA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 178 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

**ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK**

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

**INSPECTIERAPPORT**

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A1105000<sup>30</sup>

Opdrachtgever Pongers  
Contactpersoon Dhr JH Pongers  
Projectnr. 105202 Werkplannr. 105202  
Locatie adres Dorpsstraat 20 te Ijzendoorn

Datum 06-05-2011 Naam analist T.Koetse  
Tijdsduur Aankomst 14.50 Vertrek 15.50 Tijd op locatie 1 uur  
Werkzaamheden Visuele inspectie na asbestsanering Buitensituatie  
Weer Bewolkt zon T (°C) 21

**Visuele inspectie** (conform NEN 2990:2005)

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja van de Poel 08.167/107  
Omschrijving saneringswerkzaamheden: Het saneren van asbesthoudend asfalt(dakleer) en vlakke plaat  
Locatie saneringswerkzaamheden: Dakleer van het dak garage en vlakke plaat van dak loods 2.  
Wat is er verwijderd: 170 m<sup>2</sup> asfalt(dakleer) en 80 m<sup>2</sup> vlakke plaat  
Asbestsoort (gew%): dakleer 0.1-2% chrysotiel en vlakke plaat 10-15% chrysotiel  
Hechtgebonden.  
Het inspectiegebied is +/- 400 m<sup>2</sup>

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

|                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Containment aanwezig?                                                                  | O ja, m <sup>2</sup> x nee |
| Is er een sloopvergunning aanwezig                                                     | X ja O nee                 |
| Voldoende verlichting?                                                                 | X ja O nee                 |
| Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?                                             | O ja X nee                 |
| Is de ruimte droog?                                                                    | X ja O nee                 |
| Is de ruimte stofvrij?                                                                 | O ja X nee                 |
| Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?                                    | O ja X nee                 |
| Zijn oppervlakken gefixeerd?                                                           | O ja X nee                 |
| Werkplan in overeenstemming met te inspecteren object                                  | X ja O nee                 |
| Opmerkingen: niet stofvrij is geen containment. dakleer is incl. dakplaten verwijderd. |                            |

| Locatie/bouwdeel                                                                      | Aanwezig   | Resultaat |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Plafond (constructiedelen)                                                            | X ja O nee | +         |
| Kabelgoten doorvoeringen                                                              | O ja x nee |           |
| Ventilatiekanalen                                                                     | O ja x nee |           |
| Buizen                                                                                | O ja x nee |           |
| Verwarmingselementen                                                                  | O ja x nee |           |
| Kozijnen                                                                              | O ja x nee |           |
| Plinten                                                                               | O ja x nee |           |
| Vloer                                                                                 | X ja O nee | +         |
| Machines, installaties                                                                | O ja x nee |           |
| Overige, nl.                                                                          | O ja x nee |           |
| Opmerkingen: Door de grootte van het te inspecteren gebied is in 2 segmenten verdeeld |            |           |

+ = direct in orde bevonden;

+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;

A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A1105000

| Locatie/bouwdeel                                                                                                             | Resultaat constructiedeel | Resultaat aangelegen delen | Resultaat ondergelegen oppervlak | Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Garage segment 1                                                                                                             | +                         | +                          | +                                | --                                            |
| Loods 2 segment 2                                                                                                            | +                         | +                          | +                                | --                                            |
|                                                                                                                              |                           |                            |                                  |                                               |
| Niet geïnspecteerde delen: Achter de grage hoord de toplaag niet tot deze vrijgave wordt later een bodemsanering uitgevoerd. |                           |                            |                                  |                                               |

**Conclusie visuele inspectie**

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

T. Koetse

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

J Lubbers



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK


Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

## INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A1105000

Globale situatietekening

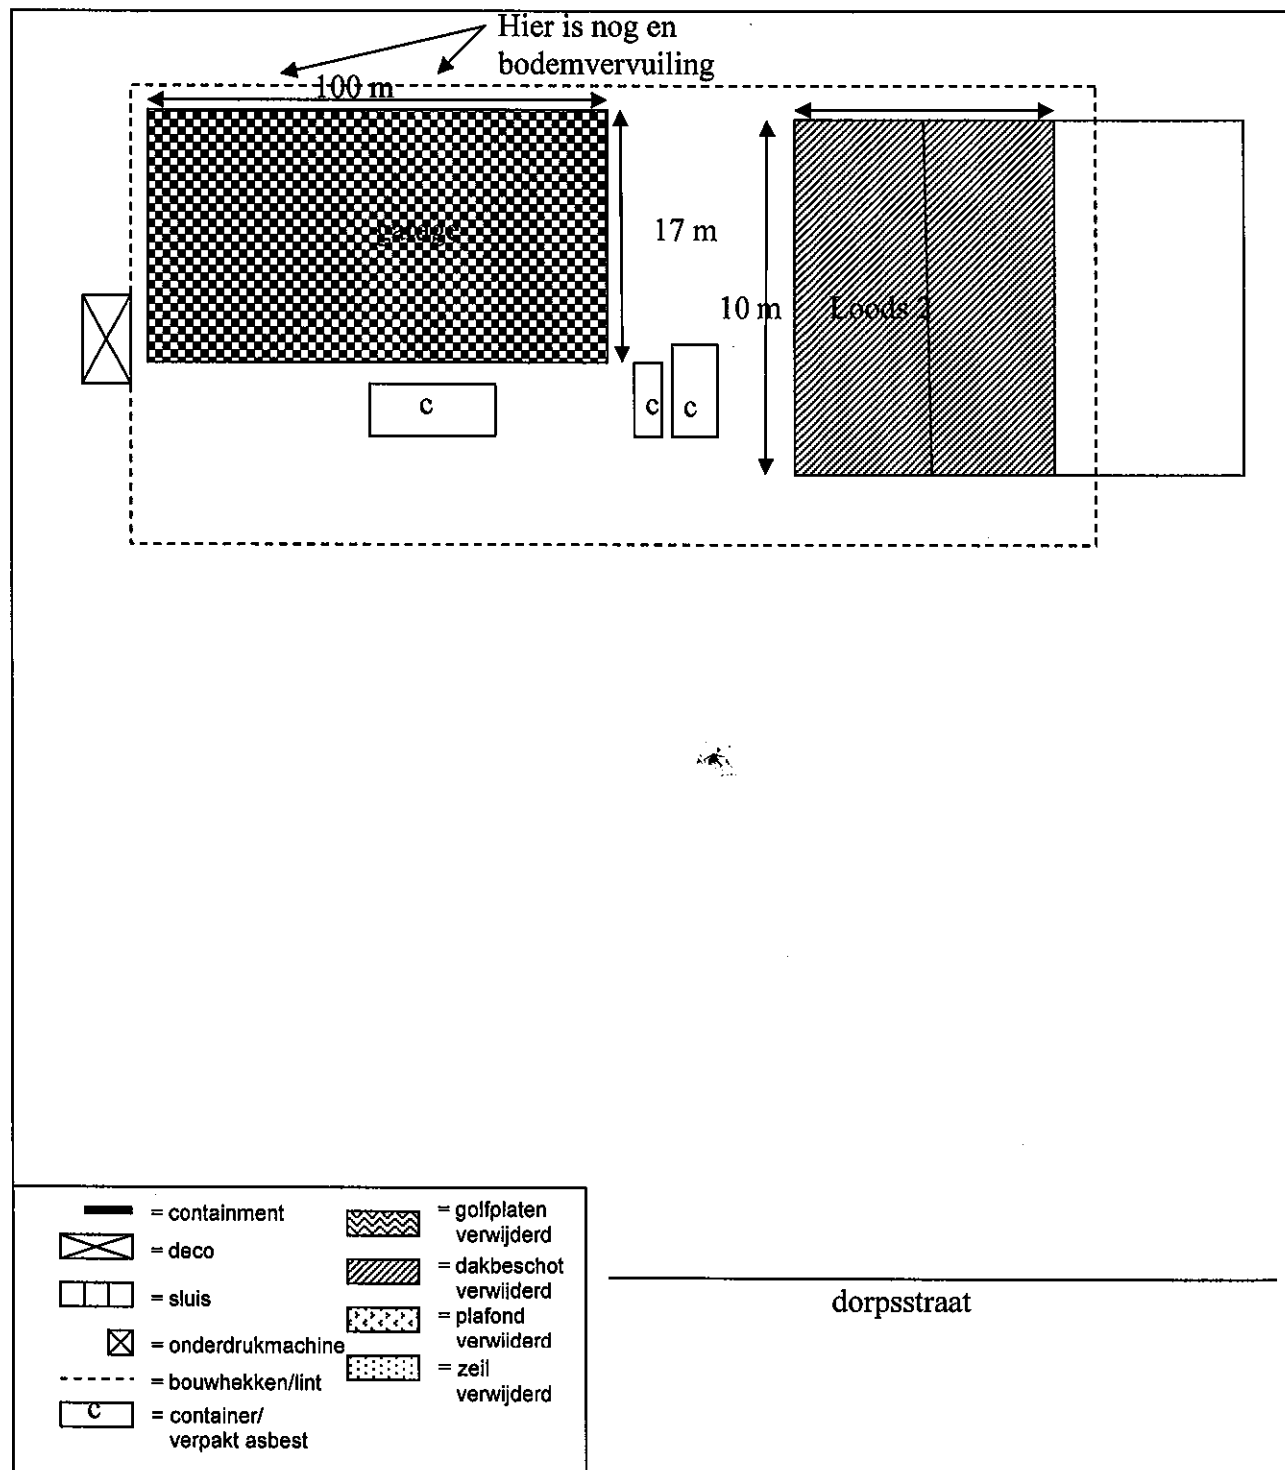

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

**ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK**

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

**INSPECTIERAPPORT**

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110300157A

| Locatie/bouwdeel | Resultaat constructiedeel | Resultaat aangelegen delen | Resultaat ondergelegen oppervlak | Opmerkingen en codering genomen kleeftmonsters |
|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Loods 1          | +                         | +                          | +                                | --                                             |
|                  |                           |                            |                                  |                                                |
|                  |                           |                            |                                  |                                                |

Niet geïnspecteerde delen: En de spouw en andere naden en kieren zijn tot visuele diepte geïnspecteerd.  
Onder de containerbak is niet geïnspecteerd.

**Conclusie visuele inspectie**

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden en/of vrijgavemetingen.

**LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)***Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.*

|                                                                              |                            |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|
| P <sub>aktueel</sub> -18 Pa                                                  | T <sub>aktueel</sub> 12 °C | bl 0       | HSE/NPL 5   | d 99,7 µm  |
| Monsternummer                                                                | 1                          | 2          |             |            |
| Pompnummer                                                                   | 23                         | 35         |             |            |
| Tijd start meting                                                            | 8.30                       | 8.30       |             |            |
| Tijd stop meting                                                             | 10.45                      | 10.45      |             |            |
| Monsterduur (min)                                                            | 134                        | 134        |             |            |
| Debiet begin/eind (l/min)                                                    | 8,2/8,2                    | 8,2/8,2    | /           | /          |
| Monstervolume (l)                                                            | 1099                       | 1099       |             |            |
| Homogene belading                                                            | X ja O nee                 | X ja O nee | O ja O nee  | O ja O nee |
| Aantal getelde velden                                                        | 100                        | 100        |             |            |
| Aantal getelde vezels (v)                                                    | 6                          | 8          |             |            |
| Vezelconcentratie (v/cm <sup>3</sup> )                                       | 0.002                      | 0.003      |             |            |
| Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm <sup>3</sup> ) |                            |            | 0.002-0.005 |            |

Opmerkingen:

**CONCLUSIE**

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm<sup>3</sup> lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

GJ Bosch



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK


Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

## INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110300157A

Globale situatietekening

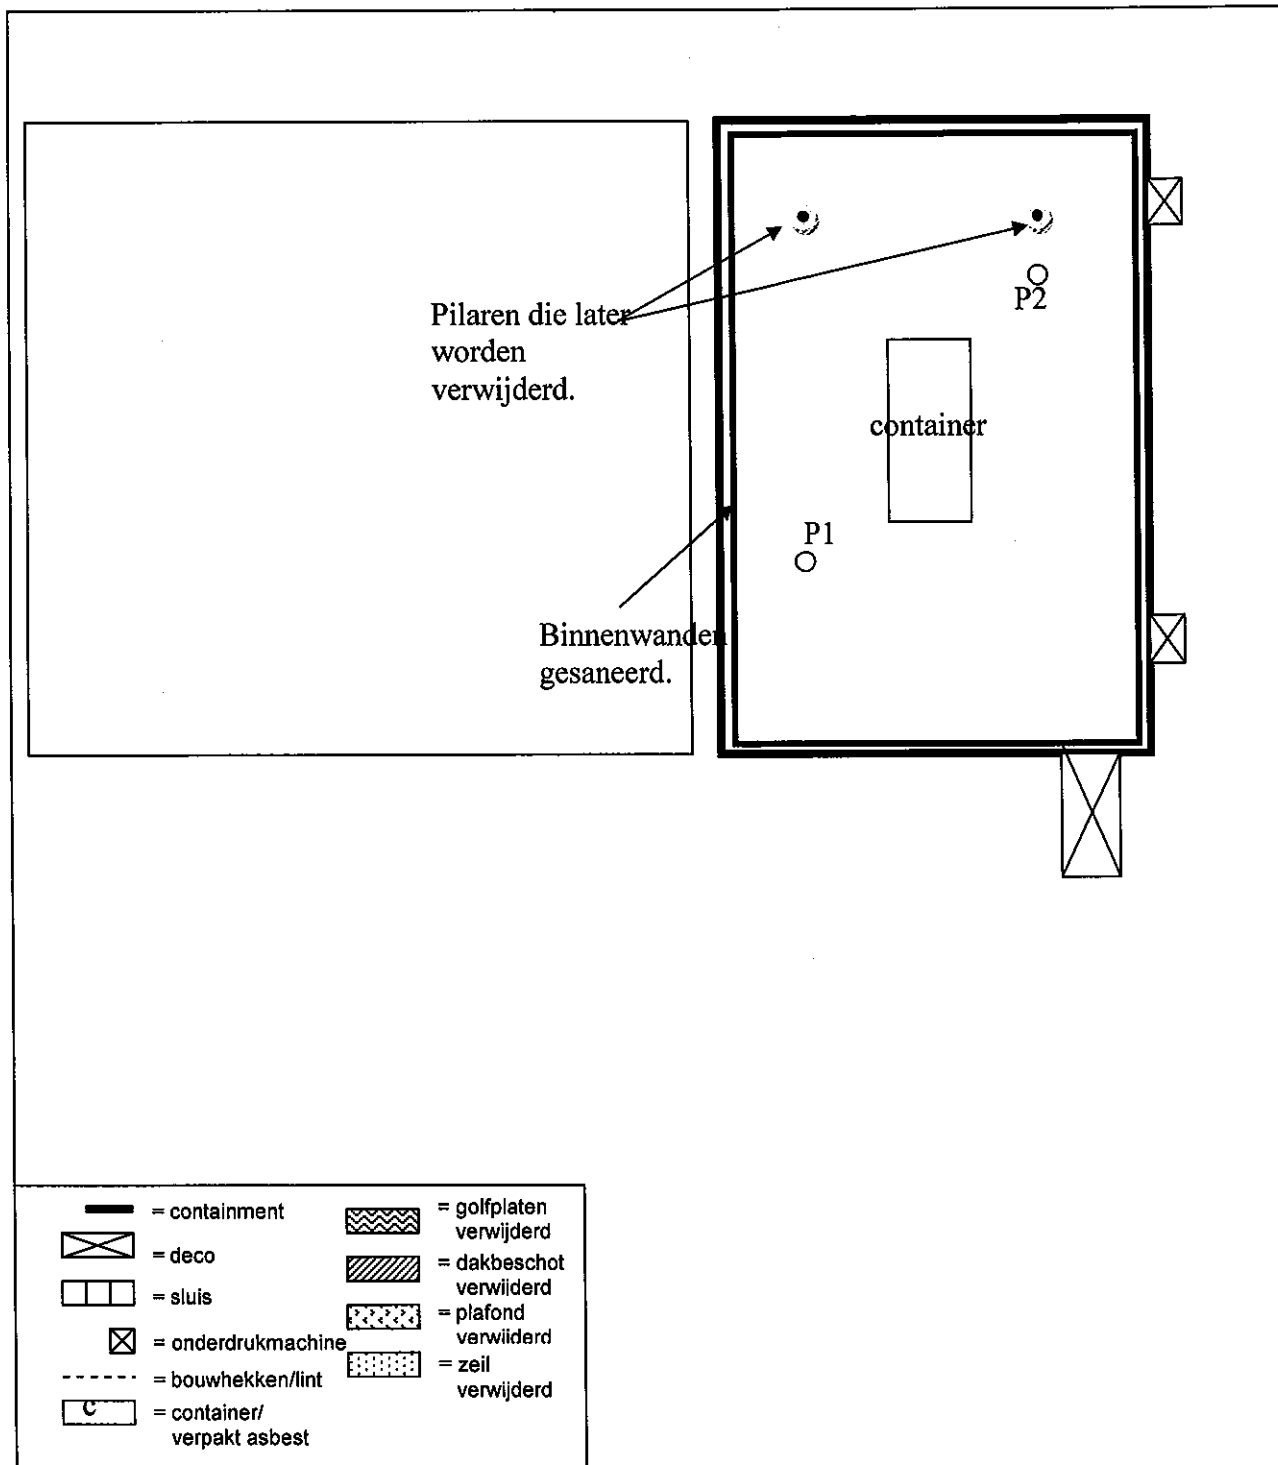

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. I 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

**ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK**

Krommendijk 20A • 7803 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

**INSPECTIERAPPORT**

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110300157A

Opdrachtgever Pongers  
Contactpersoon Dhr JH Pongers  
Projectnr. 105202 Werkplannr. 105202  
Locatie adres Dorpsstraat 20 te Ijzendoorn

Datum 21-03-2011 Naam analist T. Koetse  
Tijdsduur Aankomst 8.15 Vertrek 11.15 Tijd op locatie 3 uur  
Werkzaamheden Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie  
Weer Bewolkt zon  $T_{kalib}$  (°C) 13  
 $P_{kalib}$  (hPa) 1035

**Visuele inspectie** (conform NEN 2990:2005)

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja Van de Poel 08.167/107

Omschrijving saneringswerkzaamheden: het saneren van asbesthoudende bitumen

Locatie saneringswerkzaamheden: van de wanden van de loods 1

Wat is er verwijderd: ca. 300 m<sup>2</sup> bitumen

Asbestsoort (gew%): 2-5% chrysotiel

Niet hechtgebonden/Hechtgebonden.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

|                                                                                                                                                              |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Containment aanwezig?                                                                                                                                        | X ja, 77m <sup>2</sup> | O nee |
| Is er een sloopvergunning aanwezig                                                                                                                           | X ja                   | O nee |
| Voldoende verlichting?                                                                                                                                       | X ja                   | O nee |
| Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?                                                                                                                   | O ja                   | X nee |
| Is de ruimte droog?                                                                                                                                          | X ja                   | O nee |
| Is de ruimte stofvrij?                                                                                                                                       | X ja                   | O nee |
| Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?                                                                                                          | X ja                   | O nee |
| Zijn oppervlakken gefixeerd?                                                                                                                                 | O ja                   | X nee |
| Werkplan in overeenstemming met te inspecteren object                                                                                                        | X ja                   | O nee |
| Opmerkingen: In het containment staan pilaren van asbesthoudend materiaal. Deze worden tijdens sloop verwijderd deze maken onderdeel uit van de constructie. |                        |       |

| Locatie/bouwdeel                                                                     | Aanwezig   | Resultaat |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Plafond (constructiedelen)                                                           | X ja O nee | +         |
| Kabelgoten doorvoeringen                                                             | O ja X nee |           |
| Ventilatiekanalen                                                                    | O ja X nee |           |
| Buizen                                                                               | O ja X nee |           |
| Verwarmingselementen                                                                 | O ja X nee |           |
| Kozijnen                                                                             | O ja X nee |           |
| Plinten                                                                              | O ja X nee |           |
| Vloer                                                                                | X ja O nee | +         |
| Machines, installaties                                                               | O ja X nee |           |
| Overige, nl.                                                                         | O ja X nee |           |
| Opmerkingen: In de loods staat een containerbak die volledig is afgeplakt met folie. |            |           |

+ = direct in orde bevonden;

+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;

A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE





**ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK**

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

**INSPECTIERAPPORT**

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110300157B

Opdrachtgever Pongers  
Contactpersoon Dhr JH Pongers  
Projectnr. 105202 Werkplannr. 105202  
Locatie adres Dorpsstraat 20 te Ijzendoorn

Datum 21-03-2011 Naam analist T.Koetse  
Tijdsduur Aankomst 8.15 Vertrek 11.15 Tijd op locatie 3 uur  
Werkzaamheden Visuele inspectie na asbestsanering Buitensituatie  
Weer onbewolkt T (°C) 10

**Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)**

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja van de poel  
Omschrijving saneringswerkzaamheden: het verwijderen van asbesthoudende vlakke plaat en golfplaten  
Locatie saneringswerkzaamheden: van het dak van loods 1, 2 en platdak deuren loods 2 regengoot loods 2  
vlakke platen plafond loods 1 en 2 doorvoeren loods  
Wat is er verwijderd: 4 deuren 8 m<sup>2</sup> plafondplaat x 1 m<sup>2</sup> regengoot 81 m 2 doorvoeren 2X 30 cm en 1530 m<sup>2</sup>  
golfplaat  
Asbestsoort (gew%): vlakke plaat deur 2-5% chrysotiel rest n.b.  
Hechtgebonden.  
Het inspectiegebied is +/- 1530 m<sup>2</sup>

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

|                                                                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Containment aanwezig?                                                                                                         | O ja, m <sup>2</sup> x nee |
| Is er een sloopvergunning aanwezig                                                                                            | O ja O nee                 |
| Voldoende verlichting?                                                                                                        | O ja O nee                 |
| Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?                                                                                    | O ja O nee                 |
| Is de ruimte droog?                                                                                                           | O ja O nee                 |
| Is de ruimte stofvrij?                                                                                                        | O ja O nee                 |
| Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?                                                                           | O ja O nee                 |
| Zijn oppervlakken gefixeerd?                                                                                                  | O ja O nee                 |
| Werkplan in overeenstemming met te inspecteren object                                                                         | O ja O nee                 |
| Opmerkingen: niet stofvrij is geen containment. Door de grootte van het te inspecteren gebied is het in 6 segmenten verdeeld. |                            |

| Locatie/bouwdeel                                             | Aanwezig   | Resultaat |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Plafond (constructiedelen)                                   | X ja O nee |           |
| Kabelgoten doorvoeringen                                     | O ja x nee |           |
| Ventilatiekanalen                                            | O ja x nee |           |
| Buizen                                                       | O ja x nee |           |
| Verwarmingselementen                                         | O ja x nee |           |
| Kozijnen                                                     | O ja x nee |           |
| Plinten                                                      | O ja x nee |           |
| Vloer                                                        | X ja O nee |           |
| Machines, installaties                                       | O ja x nee |           |
| Overige, nl.                                                 | O ja x nee |           |
| Opmerkingen: Rond de gebouwen behoort niet tot deze vrijgave |            |           |

+ = direct in orde bevonden;  
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;  
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RVA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745  
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A110300157B

| Locatie/bouwdeel   | Resultaat constructiedeel | Resultaat aangelegen delen | Resultaat ondergelegen oppervlak | Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Loods 1 segment 1  | +                         | +                          | +                                | --                                            |
| Loods 1 segment 2  | +                         | +                          | +                                | --                                            |
| Platdak segment 3  |                           |                            |                                  |                                               |
| 6Loods 2 segment 4 | +                         | +                          | +                                | --                                            |
| Loods 2 segment 5  | +                         | +                          | +                                | --                                            |
| Loods 2 segment 6  |                           |                            |                                  |                                               |

Niet geïnspecteerde delen: De bodem rond de loodsen behoort niet tot deze vrijgave. Er vindt na de sloop een grondsanering plaats. Uit onderzoek is gebleken dat er asbesthoudende materialen in de bodem bevinden. Platedak bevat nog asbesthoudend dakleer dit wordt later verwijderd.

**Conclusie visuele inspectie**

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

T. Koetse

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

GJ Bosch



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN  
ONDER NR. I 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE
